מזהה	WBS	% ביצוע	שם פעילות	משך	התחלה	סיום	מרווח כולל	פעילויות קדם	פעילויות עוקבות	דד ליין מצ.ת.ה
1	1	0%	[illegible]	355 ימים	27/04/23	24/10/24	0 ימים			
2	1.1	0%	אבני דרך	355 ימים	27/04/23	24/10/24	0 ימים			
3	1.1.1	0%	א.ד. 0 - קבלת צ.ה.ע	0 ימים	27/04/23	27/04/23	42 ימים		49,50,45,46,48,4	2
4	1.1.2	0%	א.ד. 1 - התארגנות אתר ועבודות מקדימות	0 ימים	17/05/23	17/05/23	100 ימים	33	42	3
5	1.1.3	0%	א.ד. 2 - הסדרת כניסות לאתר עבודה	0 ימים	25/06/23	25/06/23	74 ימים	36	42	5
6	1.1.4	0%	א.ד. 3 - חפירה להחלפת קרקע + הסדר ניקוז בנחל	0 ימים	22/01/24	22/01/24	114 ימים	94	517	7
7	1.1.5	0%	א.ד. 4 - החלפת קרקע לכל הכבישים	0 ימים	18/09/23	18/09/23	192 ימים	103	105	14
8	1.1.6	0%	א.ד 5 - סיום עבודות כלל המערכות בכבישים (ניקוז,חשמל,ביוב)	0 ימים	01/05/24	01/05/24	46 ימים	492	493	16
9	1.1.7	0%	א.ד 6 - אספלטים בכל הכבישים	0 ימים	26/05/24	26/05/24	68 ימים	515	519	17
10	1.1.8	0%	א.ד 7 - מסירות	0 ימים	24/10/24	24/10/24	0 ימים	522	523	18
11	1.2	0%	אישורי ציוד והזמנות ציוד	79 ימים	27/04/23	21/08/23	42 ימים			
12	1.2.1	0%	ניקוז	79 ימים	27/04/23	21/08/23	213 ימים			
13	1.2.1.1	0%	הגשת ציוד ניקוז לאישור - שוחות בקרה,צנרת,מכסים ,אביזרים לפי כתב הכמויות	15 ימים	27/04/23	17/05/23	213 ימים	3	14	
14	1.2.1.2	0%	אישור ציוד ניקוז	4 ימים	18/05/23	23/05/23	213 ימים	13	15	
15	1.2.1.3	0%	הזמנה ואספקת ציוד ניקוז	60 ימים	24/05/23	21/08/23	213 ימים	14	107	
16	1.2.2	0%	ביוב	79 ימים	27/04/23	21/08/23	42 ימים			
17	1.2.2.1	0%	הגשת ציוד ביוב לאישור	15 ימים	27/04/23	17/05/23	42 ימים	3	18	
18	1.2.2.2	0%	אישור ציוד ביוב	4 ימים	18/05/23	23/05/23	42 ימים	17	19	
19	1.2.2.3	0%	הזמנה ואספקת ציוד ביוב	60 ימים	24/05/23	21/08/23	42 ימים	18	202	
20	1.3	0%	התארגנות ועבודות מקדימות	41 ימים	27/04/23	25/06/23	46 ימים			
21	1.3.1	0%	הוצאת היתרי חפירה	25 ימים	27/04/23	01/06/23	61 ימים	3	36	
22	1.3.2	0%	הוצאת היתרי עבודה לביצוע תשתיות בקן הוט	25 ימים	27/04/23	01/06/23	61 ימים	3	36	
23	1.3.3	0%	הוצאת היתרי חפירה מקורות	25 ימים	27/04/23	01/06/23	61 ימים	3	36	
24	1.3.4	0%	ביצוע מצב קיים של מודד ואישור הפיקוח לתחילת עבודות חישוף וחפירה	25 ימים	27/04/23	01/06/23	61 ימים	3	36	
25	1.3.5	0%	הזמנת ציוד לתחילת ביצוע	25 ימים	27/04/23	01/06/23	61 ימים	3	36	
26	1.3.6	0%	קבלת שטח התארגנות	25 ימים	27/04/23	01/06/23	46 ימים	3	28,27	
27	1.3.7	0%	ביצוע גידור באזורים נדרשים והצבת הסדרי בטיחות	10 ימים	04/06/23	15/06/23	51 ימים	26	36	
28	1.3.8	0%	הצבת שלט אתר	15 ימים	04/06/23	22/06/23	46 ימים	26	36	
29	1.3.9	0%	הגשת תוכנית התארגנות למועצה המקומית	25 ימים	27/04/23	01/06/23	61 ימים	3	36	
30	1.3.10	0%	הגשה ואישור צוות ניהול הפרויקט	15 ימים	27/04/23	17/05/23	71 ימים	3	36	
31	1.3.11	0%	קבלת תוכניות לביצוע	25 ימים	27/04/23	01/06/23	61 ימים	3	36	
32	1.3.12	0%	אישור ספקי חומרים	30 ימים	27/04/23	08/06/23	56 ימים	3	36	
33	1.3.13	0%	הצבת משרדי מנהלת פרויקט	15 ימים	27/04/23	17/05/23	56 ימים	3	4,35	
34	1.3.14	0%	ביצוע חפירות ובדיקות מעבדה לחתכים בכביש לטובת הנחיות למילוי אינרטי	5 ימים	28/05/23	01/06/23	110 ימים	3סה+20 ימים	43	
35	1.3.15	0%	התחברות לתשתיות זמניות	15 ימים	18/05/23	08/06/23	56 ימים	33	36	
36	1.3.16	0%	סיום עבודות התארגנות בשטח	1 יום	25/06/23	25/06/23	46 ימים	31,27,24,32,30,29,28,25,23	40,5	
37	1.4	0%	ביצוע כבישים ותשתיות	299 ימים	27/04/23	05/08/24	0 ימים			
38	1.4.1	0%	הכנות מקדימות וקבלת תוכניות לביצוע	109 ימים	27/04/23	08/10/23	87 ימים			
39	1.4.1.1	0%	עבודות מקדימות בשטח	38 ימים	26/06/23	21/08/23	46 ימים			
40	1.4.1.1.1	0%	הגדרת גבולות וסימון על ידי יתדות	1 יום	26/06/23	26/06/23	46 ימים	36	41	
41	1.4.1.1.2	0%	חישוף כלל השטח	14 ימים	27/06/23	19/07/23	46 ימים	40	272,203,99,42	
42	1.4.1.1.3	0%	עבודות עפר לגובה שתית בכל השטחים	20 ימים	20/07/23	16/08/23	59 ימים	5,4,41	43	
43	1.4.1.1.4	0%	קבלת הנחיות להחלפת קרקע עבור חומר ארטי באזור המיועדים	3 ימים	17/08/23	21/08/23	59 ימים	34,42	63,101	
44	1.4.1.2	0%	קבלת תוכניות לביצוע לאחר צו תחילת עבודה	1 יום	27/04/23	27/04/23	113 ימים			
45	1.4.1.2.1	0%	קבלת תוכניות מעודכנות של תאורה ותקשורת	1 יום	27/04/23	27/04/23	264 ימים	3	137	
46	1.4.1.2.2	0%	אישור חוזה מול נגב גז טבעי ובקשה להזמנת חומרים	1 יום	27/04/23	27/04/23	113 ימים	3	418,121	
47	1.4.1.2.3	0%	קבלת תוכניות מאגר מים	1 יום	27/04/23	27/04/23	207 ימים	3	84,82	
48	1.4.1.2.4	0%	קבלת תוכניות לביצוע מעודכנות של קו סניקה	1 יום	27/04/23	27/04/23	178 ימים	3	52	
49	1.4.1.2.5	0%	קבלת תוכניות מעודכנות לביוב חתכים 59-65 כביש 110 צפון	1 יום	27/04/23	27/04/23	154 ימים	3	334	
50	1.4.1.3	0%	מלחמת חרבות ברזל	1 יום	08/10/23	08/10/23	0 ימים	3	333,סה+15 ימים	
51	1.4.2	0%	העתקת קו סניקה	61 ימים	30/04/23	27/07/23	178 ימים			
52	1.4.2.1	0%	בדיקת התוכניות והצעות מחיר להזמנת חומרים (אין סעיף חוזי)	14 ימים	30/04/23	17/05/23	178 ימים	48	53	
53	1.4.2.2	0%	הזמנת חומרים ואספקה	3 שבועות	18/05/23	08/06/23	35.6 שבועות	52	54	
54	1.4.2.3	0%	סימון תוואי בשטח על ידי מודד מוסמך	1 יום	11/06/23	11/06/23	178 ימים	53	55	
55	1.4.2.4	0%	חפירת תעלה	4 ימים	12/06/23	15/06/23	178 ימים	54	56	
56	1.4.2.5	0%	ריתוך צנרת וקבלת אישורים	10 ימים	18/06/23	04/07/23	178 ימים	55	57	
57	1.4.2.6	0%	הנחה ועטיפת צנרת	5 ימים	05/07/23	11/07/23	178 ימים	56	58	
58	1.4.2.7	0%	בדיקות לחץ וקבלת אישורים	4 ימים	12/07/23	17/07/23	178 ימים	57	59	
59	1.4.2.8	0%	ביצוע חיבור לקו קיים	3 ימים	18/07/23	20/07/23	178 ימים	58	80,60	
60	1.4.2.9	0%	מילוי חוזר	4 ימים	23/07/23	26/07/23	178 ימים	59	61	
61	1.4.2.10	0%	מסירה לבקרת איכות סיום העתקת קו סניקה (מסירה לתאגיד)	1 יום	27/07/23	27/07/23	178 ימים	60	80	
62	1.4.3	0%	מי קולחין העתקת קווי HDPE	138 ימים	22/08/23	06/03/24	24 ימים			
63	1.4.3.1	0%	גילוי קווים קיימים	10 ימים	22/08/23	04/09/23	59 ימים	43	65	
64	1.4.3.2	0%	קו צינור בקוטר 710 מ"מ	92 ימים	30/10/23	05/03/24	24 ימים			
65	1.4.3.2.1	0%	סימון תוואי בשטח על ידי מודד מוסמך	1 יום	30/10/23	30/10/23	24 ימים	63,סה+15 ימים50	66	
66	1.4.3.2.2	0%	חפירת תעלה	7 ימים	31/10/23	08/11/23	24 ימים	65	67	
67	1.4.3.2.3	0%	ריתוך צנרת וקבלת אישורים	70 ימים	09/11/23	14/02/24	24 ימים	66	68	
68	1.4.3.2.4	0%	הנחה ועטיפת צנרת	5 ימים	15/02/24	21/02/24	24 ימים	67	69	
69	1.4.3.2.5	0%	בדיקות לחץ וקבלת אישורים	2 ימים	22/02/24	25/02/24	24 ימים	68	70	
70	1.4.3.2.6	0%	ביצוע חיבור לקו קיים	2 ימים	26/02/24	27/02/24	24 ימים	69	71	
71	1.4.3.2.7	0%	מילוי חוזר	5 ימים	28/02/24	05/03/24	24 ימים	70	80	
72	1.4.3.3	0%	קו צינור בקוטר 400 מ"מ	92 ימים	30/10/23	05/03/24	24 ימים			
73	1.4.3.3.1	0%	סימון תוואי בשטח על ידי מודד מוסמך	1 יום	30/10/23	30/10/23	24 ימים	24 ימים+15סה50	74	
74	1.4.3.3.2	0%	חפירת תעלה	7 ימים	31/10/23	08/11/23	24 ימים	73	75	
75	1.4.3.3.3	0%	ריתוך צנרת וקבלת אישורים	70 ימים	09/11/23	14/02/24	24 ימים	74	76	
76	1.4.3.3.4	0%	הנחה ועטיפת צנרת	5 ימים	15/02/24	21/02/24	24 ימים	75	77	
77	1.4.3.3.5	0%	בדיקות לחץ וקבלת אישורים	2 ימים	22/02/24	25/02/24	24 ימים	76	78	
78	1.4.3.3.6	0%	ביצוע חיבור לקו קיים	2 ימים	26/02/24	27/02/24	24 ימים	77	79	
79	1.4.3.3.7	0%	מילוי חוזר	5 ימים	28/02/24	05/03/24	24 ימים	78	80	
80	1.4.3.4	0%	סיום עבודות העתקת קווים	1 יום	06/03/24	06/03/24	24 ימים	61,79,71,59	114	
81	1.4.4	0%	מאגר מים	184 ימים	30/04/23	22/01/24	114 ימים			
82	1.4.4.1	0%	בדיקת תוכניות וכתב כמויות אישור ביצוע מהמזמין	15 ימים	30/04/23	18/05/23	207 ימים	47	84,92	
83	1.4.4.2	0%	סוללה חזית מזרחית ומערבית	70 ימים	09/10/23	14/01/24	114 ימים			
84	1.4.4.2.1	0%	חישוף שטח	8 ימים	09/10/23	18/10/23	114 ימים	82,47,50	85	
85	1.4.4.2.2	0%	חפירת תעלות	15 ימים	19/10/23	08/11/23	114 ימים	84	86	
86	1.4.4.2.3	0%	הידוק שתית	3 ימים	09/11/23	13/11/23	114 ימים	85	87	
87	1.4.4.2.4	0%	מילוי והידוק מבוקר	8 ימים	14/11/23	23/11/23	114 ימים	86	88	
88	1.4.4.2.5	0%	פיזור מצע סוג א כולל הידוק מבוקר	15 ימים	26/11/23	14/12/23	114 ימים	87	89	
89	1.4.4.2.6	0%	ביצוע יציקות בטון תעלות וקורות	15 ימים	17/12/23	04/01/24	114 ימים	88	90	
90	1.4.4.2.7	0%	ביצוע יציקת כניסת מובל	6 ימים	07/01/24	14/01/24	114 ימים	89	94	
91	1.4.4.3	0%	ביצוע בור מאגר	20 ימים	21/05/23	18/06/23	257 ימים			
92	1.4.4.3.1	0%	חפירה בקרקע מעל 1.5 מטר הוצאה והידוק מבוקר	10 ימים	21/05/23	04/06/23	257 ימים	82	93	
93	1.4.4.3.2	0%	מילוי בחומר נברר כולל הידוק מבוקר	10 ימים	05/06/23	18/06/23	257 ימים	92	94	
94	1.4.4.4	0%	סיום עבודות מאגר מים	6 ימים	15/01/24	22/01/24	114 ימים	93,90	6,517	
95	1.4.5	0%	כביש 110	298 ימים	30/04/23	05/08/24	0 ימים			
96	1.4.5.1	0%	כביש 110 דרום	298 ימים	30/04/23	05/08/24	0 ימים			
97	1.4.5.1.1	0%	כביש 110 מחתך 00-011	298 ימים	30/04/23	05/08/24	0 ימים			
98	1.4.5.1.1.1	0%	חפירות ומילוי חוזר	41 ימים	20/07/23	18/09/23	90 ימים			
99	1.4.5.1.1.1.1	0%	חפירה לגובה שתית במבנה כביש	30 ימים	20/07/23	30/08/23	90 ימים	41	152,100	
100	1.4.5.1.1.1.2	0%	עיבוד שתית חרסיתית לעומק 40ס"מ לכל רוחב רצועת הסלילה לרבות החזרתקרקע מקומית חפורה בעובי	3 ימים	31/08/23	04/09/23	192 ימים	99	102	
101	1.4.5.1.1.1.3	0%	חפירה רדודה משופעת לצורך התקנת קו ניקוז כולל הנחת קווי צנרת בטון בצד התעלה	3 ימים	22/08/23	24/08/23	207 ימים	43	105	
102	1.4.5.1.1.1.4	0%	מילוי מחומר נברר מאושר	7 ימים	05/09/23	17/09/23	192 ימים	100	103	
103	1.4.5.1.1.1.5	0%	סיום עבודות חפירה והחלפת קרקע	1 יום	18/09/23	18/09/23	192 ימים	102	7	
104	1.4.5.1.1.2	0%	עבודות ניקוז	9 ימים	19/09/23	03/10/23	192 ימים			
105	1.4.5.1.1.2.1	0%	הידוק שתית	2 ימים	19/09/23	20/09/23	192 ימים	7,101	106	
106	1.4.5.1.1.2.2	0%	החלפת קרקע על ידי יציקת קולטנים CLSM 6.0mp	1 יום	21/09/23	21/09/23	192 ימים	105	107	
107	1.4.5.1.1.2.3	0%	התקנת תא בקרה	1 יום	26/09/23	26/09/23	192 ימים	15,106	108	
108	1.4.5.1.1.2.4	0%	התקנת והתחברויות צנרת בטון בין תאים	1 יום	27/09/23	27/09/23	192 ימים	107	109,110	
109	1.4.5.1.1.2.5	0%	לקיחת מצב קיים על ידי מודד	1 יום	28/09/23	28/09/23	192 ימים	108	110	
110	1.4.5.1.1.2.6	0%	מילוי חוזר על ידי יציקת CLSM	1 יום	01/10/23	01/10/23	192 ימים	109,108	111	
111	1.4.5.1.1.2.7	0%	מילוי חוזר CLSM עד תחתית מיסעה	1 יום	02/10/23	02/10/23	192 ימים	110	112	
112	1.4.5.1.1.2.8	0%	סיום עבודות ניקוזים - מסירה לבקרת איכות	1 יום	03/10/23	03/10/23	192 ימים	111	149	
113	1.4.5.1.1.3	0%	עבודות קווי מים	31 ימים	07/03/24	19/05/24	24 ימים			
114	1.4.5.1.1.3.1	0%	סימון תוואי בשטח על ידי מודד מוסמך	2 ימים	07/03/24	11/03/24	24 ימים	80	165,115ה	
115	1.4.5.1.1.3.2	0%	חפירת תעלה	5 ימים	12/03/24	25/03/24	37 ימים	114	116	
116	1.4.5.1.1.3.3	0%	ריתוך צנרת וקבלת אישורים	15 ימים	26/03/24	05/05/24	37 ימים	115	117ה+2 ימים	
117	1.4.5.1.1.3.4	0%	הנחה ועטיפת צנרת	15 ימים	01/04/24	07/05/24	37 ימים	116ה+2 ימים	118	
118	1.4.5.1.1.3.5	0%	בדיקות לחץ וקבלת אישורים	2 ימים	07/05/24	09/05/24	37 ימים	117	119	
119	1.4.5.1.1.3.6	0%	מילוי חוזר	5 ימים	09/05/24	19/05/24	37 ימים	118	130	
120	1.4.5.1.1.4	0%	קווי גז	48 ימים	30/04/23	10/07/23	113 ימים			
121	1.4.5.1.1.4.1	0%	קבלת חומרים בשטח על ידי נגב גז	1 יום	30/04/23	30/04/23	113 ימים	46	122	
122	1.4.5.1.1.4.2	0%	סימון תוואי בשטח על ידי מודד מוסמך	5 ימים	01/05/23	07/05/23	113 ימים	121	172,123ה	
123	1.4.5.1.1.4.3	0%	חפירת תעלה	10 ימים	08/05/23	21/05/23	113 ימים	122	124ה+3 ימים	
124	1.4.5.1.1.4.4	0%	ריתוך צנרת וקבלת אישורים	2 ימים	11/05/23	14/05/23	113 ימים	123ה+3 ימים	125ה+5 ימים	
125	1.4.5.1.1.4.5	0%	הנחה ועטיפת צנרת	20 ימים	18/05/23	15/06/23	113 ימים	124ה+5 ימים	235,126	
126	1.4.5.1.1.4.6	0%	בדיקות לחץ וקבלת אישורים	4 ימים	18/06/23	21/06/23	216 ימים	125	127	
127	1.4.5.1.1.4.7	0%	מילוי חוזר	7 ימים	22/06/23	05/07/23	216 ימים	126	128	
128	1.4.5.1.1.4.8	0%	סיום עבודות גז ומסירה לבקרת איכות	3 ימים	06/07/23	10/07/23	216 ימים	127	137,149	
129	1.4.5.1.1.5	0%	תשתיות השקייה	12 ימים	19/05/24	04/06/24	37 ימים			
130	1.4.5.1.1.5.1	0%	סימון תוואי בשטח על ידי מודד מוסמך	3 ימים	19/05/24	22/05/24	37 ימים	119	131	
131	1.4.5.1.1.5.2	0%	חפירת תעלה	3 ימים	22/05/24	27/05/24	37 ימים	130	132	
132	1.4.5.1.1.5.3	0%	הנחת צנרת פי ו' סי וסרט סימון	1 יום	27/05/24	28/05/24	37 ימים	131	133	
133	1.4.5.1.1.5.4	0%	מדידת מצב קיים לקיחת אזמייד לפני מילוי	1 יום	28/05/24	29/05/24	37 ימים	132	134	
134	1.4.5.1.1.5.5	0%	עטיפת צנרת	1 יום	29/05/24	30/05/24	37 ימים	133	135	
135	1.4.5.1.1.5.6	0%	מילוי חוזר	3 ימים	30/05/24	04/06/24	37 ימים	134	143	
136	1.4.5.1.1.6	0%	עבודות חשמל ותקשורת	1 יום	12/06/24	13/06/24	0 ימים			
137	1.4.5.1.1.6.1	0%	סימון תוואי בשטח על ידי מודד מוסמך	3 ימים	12/06/24	23/06/24	0 ימים	128,45	138	
138	1.4.5.1.1.6.2	0%	חפירת תעלה	3 ימים	23/06/24	26/06/24	0 ימים	137	139	
139	1.4.5.1.1.6.3	0%	הנחת צנרת פי ו' סי וסרט סימון	4 ימים	26/06/24	02/07/24	0 ימים	138	140	
140	1.4.5.1.1.6.4	0%	מדידת מצב קיים לקיחת אזמייד לפני מילוי	3 ימים	02/07/24	07/07/24	0 ימים	139	141	
141	1.4.5.1.1.6.5	0%	עטיפת צנרת	3 ימים	07/07/24	10/07/24	0 ימים	140	142	
142	1.4.5.1.1.6.6	0%	מילוי חוזר	3 ימים	10/07/24	15/07/24	0 ימים	141	145,143	
143	1.4.5.1.1.6.7	0%	סיום עבודות חשמל ותאורה	1 יום	15/07/24	16/07/24	13 ימים	315,255,185,135,142	149	
144	1.4.5.1.1.7	0%	מיסעה	14 ימים	15/07/24	04/08/24	0 ימים			
145	1.4.5.1.1.7.1	0%	פיזור שכבת מצע א כולל הידוק ובדיקת מעבדה שכבה 1	4 ימים	15/07/24	21/07/24	0 ימים	142	146	
146	1.4.5.1.1.7.2	0%	פיזור שכבת מצע א כולל הידוק ובדיקת מעבדה שכבה 2	4 ימים	21/07/24	25/07/24	0 ימים	145	147	
147	1.4.5.1.1.7.3	0%	לקיחת מצב קיים מודד הכנה לאספלט	3 ימים	25/07/24	30/07/24	0 ימים	146	148	
148	1.4.5.1.1.7.4	0%	סיום עבודות מיסעה	3 ימים	30/07/24	04/08/24	0 ימים	147	149	
149	1.4.5.1.1.8	0%	סיום עבודות כביש 110 מחתך 00-011	1 יום	04/08/24	05/08/24	0 ימים	112,143,128,148	517	
150	1.4.5.1.2	0%	כביש 110 מחתך 020-012	271 ימים	01/05/23	30/06/24	24 ימים			
151	1.4.5.1.2.1	0%	חפירות ומילוי חוזר	13 ימים	31/08/23	20/09/23	90 ימים			
152	1.4.5.1.2.1.1	0%	חפירה לגובה שתית במבנה כביש	3 ימים	31/08/23	04/09/23	90 ימים	99	153	
153	1.4.5.1.2.1.2	0%	עיבוד שתית חרסיתית לעומק 40ס"מ לכל רוחב רצועת הסלילה לרבות החזרתקרקע מקומית חפורה בעובי	3 ימים	05/09/23	11/09/23	90 ימים	152	154	
154	1.4.5.1.2.1.3	0%	חפירה רדודה משופעת לצורך התקנת קו ניקוז כולל הנחת קווי צנרת בטון בצד התעלה	7 ימים	12/09/23	20/09/23	90 ימים	153	156	
155	1.4.5.1.2.2	0%	עבודות ניקוז	100 ימים	09/10/23	25/02/24	80 ימים			
156	1.4.5.1.2.2.1	0%	הידוק שתית	1 יום	09/10/23	09/10/23	80 ימים	154,50	157	
157	1.4.5.1.2.2.2	0%	החלפת קרקע על ידי יציקת CLSM 6.0mp	1 יום	10/10/23	10/10/23	80 ימים	156	158	
158	1.4.5.1.2.2.3	0%	התקנת תא בקרה	1 יום	11/10/23	11/10/23	80 ימים	157	159	
159	1.4.5.1.2.2.4	0%	התקנת והתחברויות צנרת בטון בין תאים	5 ימים	12/10/23	18/10/23	80 ימים	158	160	
160	1.4.5.1.2.2.5	0%	לקיחת מצב קיים על ידי מודד	5 ימים	19/10/23	25/10/23	80 ימים	159	161	
161	1.4.5.1.2.2.6	0%	מילוי חוזר על ידי יציקת CLSM	5 ימים	26/10/23	01/11/23	80 ימים	160	162	
162	1.4.5.1.2.2.7	0%	מילוי חוזר CLSM עד תחתית מיסעה	2 ימים	02/11/23	05/11/23	80 ימים	161	163	
163	1.4.5.1.2.2.8	0%	סיום עבודות ניקוזים - מסירה לבקרת איכות	80 ימים	06/11/23	25/02/24	80 ימים	162	198	
164	1.4.5.1.2.3	0%	עבודות קווי מים	44 ימים	07/03/24	05/06/24	24 ימים			
165	1.4.5.1.2.3.1	0%	סימון תוואי בשטח על ידי מודד מוסמך	2 ימים	07/03/24	11/03/24	24 ימים	114ה	166	
166	1.4.5.1.2.3.2	0%	חפירת תעלה	5 ימים	12/03/24	25/03/24	24 ימים	165	167	
167	1.4.5.1.2.3.3	0%	ריתוך צנרת וקבלת אישורים	15 ימים	26/03/24	05/05/24	24 ימים	166	168	
168	1.4.5.1.2.3.4	0%	הנחה ועטיפת צנרת	15 ימים	05/05/24	27/05/24	24 ימים	167	169	
169	1.4.5.1.2.3.5	0%	בדיקות לחץ וקבלת אישורים	2 ימים	27/05/24	29/05/24	24 ימים	168	170	
170	1.4.5.1.2.3.6	0%	מילוי חוזר	5 ימים	29/05/24	05/06/24	24 ימים	169	180	
171	1.4.5.1.2.4	0%	קווי גז	51 ימים	01/05/23	16/07/23	208 ימים			
172	1.4.5.1.2.4.1	0%	סימון תוואי בשטח על ידי מודד מוסמך	5 ימים	01/05/23	07/05/23	208 ימים	122ה	173	
173	1.4.5.1.2.4.2	0%	חפירת תעלה	10 ימים	08/05/23	21/05/23	208 ימים	172	174	
174	1.4.5.1.2.4.3	0%	ריתוך צנרת וקבלת אישורים	2 ימים	22/05/23	23/05/23	208 ימים	173	175	
175	1.4.5.1.2.4.4	0%	הנחה ועטיפת צנרת	20 ימים	24/05/23	21/06/23	208 ימים	174	176	
176	1.4.5.1.2.4.5	0%	בדיקות לחץ וקבלת אישורים	4 ימים	22/06/23	27/06/23	208 ימים	175	177	
177	1.4.5.1.2.4.6	0%	מילוי חוזר	7 ימים	03/07/23	11/07/23	208 ימים	176	178	
178	1.4.5.1.2.4.7	0%	סיום עבודות גז ומסירה לבקרת איכות	3 ימים	12/07/23	16/07/23	208 ימים	177	187,198	
179	1.4.5.1.2.5	0%	תשתיות השקייה	12 ימים	05/06/24	30/06/24	24 ימים			
180	1.4.5.1.2.5.1	0%	סימון תוואי בשטח על ידי מודד מוסמך	3 ימים	05/06/24	10/06/24	24 ימים	170	181	
181	1.4.5.1.2.5.2	0%	חפירת תעלה	3 ימים	10/06/24	16/06/24	24 ימים	180	182	
182	1.4.5.1.2.5.3	0%	הנחת צנרת פי ו' סי וסרט סימון	1 יום	16/06/24	23/06/24	24 ימים	181	183	
183	1.4.5.1.2.5.4	0%	מדידת מצב קיים לקיחת אזמייד לפני מילוי	1 יום	23/06/24	24/06/24	24 ימים	182	184	
184	1.4.5.1.2.5.5	0%	עטיפת צנרת	1 יום	24/06/24	25/06/24	24 ימים	183	185	
185	1.4.5.1.2.5.6	0%	מילוי חוזר	3 ימים	25/06/24	30/06/24	24 ימים	184	143	
186	1.4.5.1.2.6	0%	עבודות חשמל ותקשורת	12 ימים	17/07/23	01/08/23	208 ימים			
187	1.4.5.1.2.6.1	0%	סימון תוואי בשטח על ידי מודד מוסמך	3 ימים	17/07/23	19/07/23	208 ימים	178	188	
188	1.4.5.1.2.6.2	0%	חפירת תעלה	3 ימים	20/07/23	24/07/23	208 ימים	187	189	
189	1.4.5.1.2.6.3	0%	הנחת צנרת פי ו' סי וסרט סימון	1 יום	25/07/23	25/07/23	208 ימים	188	190	
190	1.4.5.1.2.6.4	0%	מדידת מצב קיים לקיחת אזמייד לפני מילוי	1 יום	26/07/23	26/07/23	208 ימים	189	191	
191	1.4.5.1.2.6.5	0%	עטיפת צנרת	1 יום	27/07/23	27/07/23	208 ימים	190	192	
192	1.4.5.1.2.6.6	0%	מילוי חוזר	3 ימים	30/07/23	01/08/23	208 ימים	191	194	
193	1.4.5.1.2.7	0%	מיסעה	16 ימים	02/08/23	23/08/23	208 ימים			
194	1.4.5.1.2.7.1	0%	פיזור שכבת מצע א כולל הידוק ובדיקת מעבדה שכבה 1	5 ימים	02/08/23	08/08/23	208 ימים	192	195	
195	1.4.5.1.2.7.2	0%	פיזור שכבת מצע א כולל הידוק ובדיקת מעבדה שכבה 2	5 ימים	09/08/23	15/08/23	208 ימים	194	196	
196	1.4.5.1.2.7.3	0%	לקיחת מצב קיים מודד הכנה לאספלט + כולל אישור מתכננים	5 ימים	16/08/23	22/08/23	208 ימים	195	197	
197	1.

מזהה	ביצוע %	WBS	שם פעילות	משך	התחלה	סיום	פעילויות קדם	מרווח כולל	פעילויות עוקבות	דד ליין מצ.ת.ה.
214	0%	1.4.5.2.1.1.4.9	**סיום עבודות ביוב**	30 ימים	08/10/23	16/11/23	213 ימים 89		268,216	
215	0%	**1.4.5.2.1.2**	**עבודות ניקוז**	**62 ימים**	**19/11/23**	**12/02/24**	**ימים 89**			
216	0%	1.4.5.2.1.2.1	הידוק שתית	3 ימים	19/11/23	21/11/23	214,204 ימים 89		217	
217	0%	1.4.5.2.1.2.2	CLSM 6.0mp החלפת קרקע על ידי יציקת	2 ימים	22/11/23	23/11/23	216 ימים 89		218,278הה	
218	0%	1.4.5.2.1.2.3	התקנת תא בקרה	2 ימים	26/11/23	27/11/23	217 ימים 89		219	
219	0%	1.4.5.2.1.2.4	התקנת והתחברויות צנרת בטון בין תאים	5 ימים	28/11/23	04/12/23	218 ימים 89		220	
220	0%	1.4.5.2.1.2.5	לקיחת מצב קיים על ידי מודד	1 יום	05/12/23	05/12/23	219 ימים 89		221	
221	0%	1.4.5.2.1.2.6	CLSM מילוי חוזר על ידי יציקת	4 ימים	06/12/23	11/12/23	220 ימים 89		222	
222	0%	1.4.5.2.1.2.7	עד תחתית מיסעה CLSM מילוי חוזר	15 ימים	12/12/23	01/01/24	221 ימים 89		223	
223	0%	1.4.5.2.1.2.8	**סיום עבודות ניקוזים - מסירה לבקרת איכות**	30 ימים	02/01/24	12/02/24	222 ימים 89		268,283הה	
224	0%	**1.4.5.2.1.3**	**ביוב**	**63 ימים**	**23/08/23**	**23/11/23**	**ימים 42**			
225	0%	1.4.5.2.1.3.1	CLSM מתחת לשוחות החלפת קרקע ומילוי על ידי	10 ימים	23/08/23	05/09/23	202 ימים 42		226	
226	0%	1.4.5.2.1.3.2	פיזור חול וביצוע שיפועים נדרשים	5 ימים	10/09/23	14/09/23	225 ימים 42		227	
227	0%	1.4.5.2.1.3.3	הנחת שוחות ביוב והתאמת גבהים לפי תוכנית	5 ימים	17/09/23	21/09/23	226 ימים 42		228	
228	0%	1.4.5.2.1.3.4	התקנת צנרת פי ו׳ סי לפי תוכנית והתאמת שיפועים נדרשים כולל בדיקות	10 ימים	26/09/23	09/10/23	227 ימים 42		229	
229	0%	1.4.5.2.1.3.5	לקיחת מצב קיים	3 ימים	10/10/23	12/10/23	228 ימים 42		230,333	
230	0%	1.4.5.2.1.3.6	ריפוד צנרת על ידי חול מאושר כולל סימון בסרט	2 ימים	15/10/23	16/10/23	229 ימים 146		231	
231	0%	1.4.5.2.1.3.7	מילוי חוזר מאושר	6 ימים	17/10/23	24/10/23	230 ימים 146		232	
232	0%	1.4.5.2.1.3.8	ביצוע בדיקות מעבדה נדרשות כולל שטיפה	5 ימים	25/10/23	31/10/23	231 ימים 146		328,233	
233	0%	1.4.5.2.1.3.9	**סיום עבודות ביוב**	17 ימים	01/11/23	23/11/23	232 ימים 146		328,293הה	
234	0%	**1.4.5.2.1.4**	**קווי גז**	**41 ימים**	**18/06/23**	**16/08/23**	**ימים 113**			
235	0%	1.4.5.2.1.4.1	סימון תוואי בשטח על ידי מודד מוסמך	5 ימים	18/06/23	22/06/23	125 ימים 113		236	
236	0%	1.4.5.2.1.4.2	חפירת תעלה	10 ימים	25/06/23	11/07/23	235 ימים 113		237	
237	0%	1.4.5.2.1.4.3	ריתוך צנרת וקבלת אישורים	2 ימים	12/07/23	13/07/23	236 ימים 113		238	
238	0%	1.4.5.2.1.4.4	הנחה ועטיפת צנרת	10 ימים	16/07/23	27/07/23	237 ימים 113		239	
239	0%	1.4.5.2.1.4.5	בדיקות לחץ וקבלת אישורים	4 ימים	30/07/23	02/08/23	238 ימים 113		240,295	
240	0%	1.4.5.2.1.4.6	מילוי חוזר	7 ימים	03/08/23	13/08/23	239 ימים 168		241,243,257	
241	0%	1.4.5.2.1.4.7	**סיום עבודות גז ומסירה לבקרת איכות**	3 ימים	14/08/23	16/08/23	240 ימים 221		268	
242	0%	**1.4.5.2.1.5**	**עבודות קווי מים**	**44 ימים**	**14/08/23**	**18/10/23**	**ימים 168**			
243	0%	1.4.5.2.1.5.1	סימון תוואי בשטח על ידי מודד מוסמך	2 ימים	14/08/23	15/08/23	240 ימים 168		244	
244	0%	1.4.5.2.1.5.2	חפירת תעלה	5 ימים	16/08/23	22/08/23	243 ימים 168		245	
245	0%	1.4.5.2.1.5.3	ריתוך צנרת וקבלת אישורים	15 ימים	23/08/23	14/09/23	244 ימים 168		246	
246	0%	1.4.5.2.1.5.4	הנחה ועטיפת צנרת	15 ימים	17/09/23	09/10/23	245 ימים 168		247	
247	0%	1.4.5.2.1.5.5	בדיקות לחץ וקבלת אישורים	2 ימים	10/10/23	11/10/23	246 ימים 168		248	
248	0%	1.4.5.2.1.5.6	מילוי חוזר	5 ימים	12/10/23	18/10/23	247 ימים 168		250	
249	0%	**1.4.5.2.1.6**	**תשתיות השקייה**	**12 ימים**	**19/10/23**	**05/11/23**	**ימים 168**			
250	0%	1.4.5.2.1.6.1	סימון תוואי בשטח על ידי מודד מוסמך	3 ימים	19/10/23	23/10/23	248 ימים 168		251	
251	0%	1.4.5.2.1.6.2	חפירת תעלה	3 ימים	24/10/23	26/10/23	250 ימים 168		252	
252	0%	1.4.5.2.1.6.3	הנחת צנרת פי ו׳ סי וסרט סימון	1 יום	29/10/23	29/10/23	251 ימים 168		253	
253	0%	1.4.5.2.1.6.4	מדידת מצב קיים לקיחת אזמייד לפני מילוי	1 יום	30/10/23	30/10/23	252 ימים 168		254	
254	0%	1.4.5.2.1.6.5	עטיפת צנרת	1 יום	31/10/23	31/10/23	253 ימים 168		255	
255	0%	1.4.5.2.1.6.6	מילוי חוזר	3 ימים	01/11/23	05/11/23	254 ימים 168		143	
256	0%	**1.4.5.2.1.7**	**עבודות חשמל ותקשורת**	**12 ימים**	**14/08/23**	**29/08/23**	**ימים 201**			
257	0%	1.4.5.2.1.7.1	סימון תוואי בשטח על ידי מודד מוסמך	3 ימים	14/08/23	16/08/23	240 ימים 201		258	
258	0%	1.4.5.2.1.7.2	חפירת תעלה	3 ימים	17/08/23	21/08/23	257 ימים 201		259	
259	0%	1.4.5.2.1.7.3	הנחת צנרת פי ו׳ סי וסרט סימון	1 יום	22/08/23	22/08/23	258 ימים 201		260	
260	0%	1.4.5.2.1.7.4	מדידת מצב קיים לקיחת אזמייד לפני מילוי	1 יום	23/08/23	23/08/23	259 ימים 201		261	
261	0%	1.4.5.2.1.7.5	עטיפת צנרת	1 יום	24/08/23	24/08/23	260 ימים 201		262	
262	0%	1.4.5.2.1.7.6	מילוי חוזר	3 ימים	27/08/23	29/08/23	261 ימים 201		264	
263	0%	**1.4.5.2.1.8**	**מיסעה**	**11 ימים**	**30/08/23**	**17/09/23**	**ימים 201**			
264	0%	1.4.5.2.1.8.1	חור שכבת מצע א כולל הידוק ובדיקת מעבדה שכבה 1	3 ימים	30/08/23	03/09/23	262 ימים 201		265	
265	0%	1.4.5.2.1.8.2	חור שכבת מצע א כולל הידוק ובדיקת מעבדה שכבה 2	3 ימים	04/09/23	10/09/23	264 ימים 201		266	
266	0%	1.4.5.2.1.8.3	לקיחת מצב קיים מודד הכנה לאספלט	1 יום	11/09/23	11/09/23	265 ימים 201		267	
267	0%	1.4.5.2.1.8.4	הנחת אבני שפה	4 ימים	12/09/23	17/09/23	266 ימים 201		268	
268	0%	1.4.5.2.1.9	**סיום עבודות כביש 110 חתך 075-083**	1 יום	13/02/24	13/02/24	267,213,214,223,241 ימים 97		388	
269	0%	**1.4.5.2.2**	**כביש 110 חתך 066-074**	**186 ימים**	**20/07/23**	**08/05/24**	**ימים 46**			
270	0%	**1.4.5.2.2.1**	**חפירות ומילוי חוזר**	**43 ימים**	**20/07/23**	**20/09/23**	**ימים 46**			
271	0%	1.4.5.2.2.1.1	חפירה לביובים	20 ימים	22/08/23	20/09/23	202הה ימים 48		285	
272	0%	1.4.5.2.2.1.2	חפירה לגובה שתית במבנה כביש	1 יום	20/07/23	20/07/23	41 ימים 46		285,273,331,394	
273	0%	1.4.5.2.2.1.3	עיבוד שתית חרסיתית לעומק 40ס"מ לכל רוחב רצועת הסלילה לרבות החזרתקרקע מקומית חפורה בעובי 20ס"מ	4 ימים	23/07/23	26/07/23	272 ימים 86		285,274	
274	0%	1.4.5.2.2.1.4	מילוי מחומר נברר מאושר	3 ימים	27/07/23	31/07/23	273 ימים 172		275	
275	0%	1.4.5.2.2.1.5	חפירה רדודה לקווי ניקוז	7 ימים	01/08/23	09/08/23	274 ימים 172		277	
276	0%	**1.4.5.2.2.2**	**עבודות ניקוז**	**129 ימים**	**10/08/23**	**12/02/24**	**ימים 89**			
277	0%	1.4.5.2.2.2.1	הידוק שתית	3 ימים	10/08/23	14/08/23	275 ימים 172		278	
278	0%	1.4.5.2.2.2.2	CLSM 6.0mp החלפת קרקע על ידי יציקת	2 ימים	22/11/23	23/11/23	217הה,277 ימים 105		279	
279	0%	1.4.5.2.2.2.3	התקנת תא בקרה	4 ימים	26/11/23	29/11/23	278 ימים 105		280	
280	0%	1.4.5.2.2.2.4	התקנת והתחברויות צנרת בטון בין תאים	3 ימים	30/11/23	04/12/23	279 ימים 105		281	
281	0%	1.4.5.2.2.2.5	לקיחת מצב קיים על ידי מודד	2 ימים	05/12/23	06/12/23	280 ימים 105		282	
282	0%	1.4.5.2.2.2.6	עד תחתית מיסעה CLSM מילוי חוזר	2 ימים	07/12/23	10/12/23	281 ימים 105		283	
283	0%	1.4.5.2.2.2.7	**סיום עבודות ניקוזים - מסירה לבקרת איכות**	30 ימים	02/01/24	12/02/24	223הה,282 ימים 89		328	
284	0%	**1.4.5.2.2.3**	**ביוב**	**142 ימים**	**21/09/23**	**07/05/24**	**ימים 48**			
285	0%	1.4.5.2.2.3.1	CLSM מתחת לשוחות החלפת קרקע ומילוי על ידי	10 ימים	21/09/23	11/10/23	272,273,271 ימים 48		286	
286	0%	1.4.5.2.2.3.2	פיזור חול וביצוע שיפועים נדרשים	5 ימים	12/10/23	02/11/23	285 ימים 48		287	
287	0%	1.4.5.2.2.3.3	הנחת שוחות ביוב והתאמת גבהים לפי תוכנית	5 ימים	05/11/23	29/11/23	286 ימים 48		288	
288	0%	1.4.5.2.2.3.4	התקנת צנרת פי ו׳ סי לפי תוכנית והתאמת שיפועים נדרשים כולל בדיקות	10 ימים	30/11/23	07/01/24	287 ימים 48		289	
289	0%	1.4.5.2.2.3.5	לקיחת מצב קיים	3 ימים	08/01/24	14/02/24	288 ימים 48		290	
290	0%	1.4.5.2.2.3.6	ריפוד צנרת על ידי חול מאושר כולל סימון בסרט	2 ימים	15/02/24	10/04/24	289 ימים 48		291	
291	0%	1.4.5.2.2.3.7	מילוי חוזר מאושר	6 ימים	11/04/24	28/04/24	290 ימים 48		292	
292	0%	1.4.5.2.2.3.8	ביצוע בדיקות מעבדה נדרשות כולל שטיפה	5 ימים	28/04/24	07/05/24	291 ימים 48		328	
293	0%	1.4.5.2.2.3.9	**סיום עבודות ביוב**	17 ימים	01/11/23	23/11/23	233הה ימים 146		328	
294	0%	**1.4.5.2.2.4**	**קווי גז**	**51 ימים**	**03/08/23**	**18/10/23**	**ימים 113**			
295	0%	1.4.5.2.2.4.1	סימון תוואי בשטח על ידי מודד מוסמך	5 ימים	03/08/23	09/08/23	239 ימים 113		296,303	
296	0%	1.4.5.2.2.4.2	חפירת תעלה	10 ימים	10/08/23	23/08/23	295 ימים 113		297	
297	0%	1.4.5.2.2.4.3	ריתוך צנרת וקבלת אישורים	2 ימים	24/08/23	27/08/23	296 ימים 113		298	
298	0%	1.4.5.2.2.4.4	הנחה ועטיפת צנרת	20 ימים	28/08/23	28/09/23	297 ימים 113		299	
299	0%	1.4.5.2.2.4.5	בדיקות לחץ וקבלת אישורים	4 ימים	01/10/23	04/10/23	298 ימים 113		300	
300	0%	1.4.5.2.2.4.6	מילוי חוזר	7 ימים	05/10/23	15/10/23	299 ימים 113		301,304	
301	0%	1.4.5.2.2.4.7	**סיום עבודות גז ומסירה לבקרת איכות**	3 ימים	16/10/23	18/10/23	300 ימים 172		328	
302	0%	**1.4.5.2.2.5**	**עבודות קווי מים**	**85 ימים**	**10/08/23**	**12/12/23**	**ימים 115**			
303	0%	1.4.5.2.2.5.1	סימון תוואי בשטח על ידי מודד מוסמך	2 ימים	10/08/23	13/08/23	295 ימים 198		317הה	
304	0%	1.4.5.2.2.5.2	חפירת תעלה	5 ימים	16/10/23	22/10/23	300 ימים 113		305	
305	0%	1.4.5.2.2.5.3	ריתוך צנרת וקבלת אישורים	15 ימים	23/10/23	12/11/23	304 ימים 113		306	
306	0%	1.4.5.2.2.5.4	הנחה ועטיפת צנרת	15 ימים	13/11/23	03/12/23	305 ימים 113		307	
307	0%	1.4.5.2.2.5.5	בדיקות לחץ וקבלת אישורים	2 ימים	04/12/23	05/12/23	306 ימים 113		308	
308	0%	1.4.5.2.2.5.6	מילוי חוזר	5 ימים	06/12/23	12/12/23	307 ימים 113		310	
309	0%	**1.4.5.2.2.6**	**תשתיות השקייה**	**12 ימים**	**13/12/23**	**28/12/23**	**ימים 113**			
310	0%	1.4.5.2.2.6.1	סימון תוואי בשטח על ידי מודד מוסמך	3 ימים	13/12/23	17/12/23	308 ימים 113		311	
311	0%	1.4.5.2.2.6.2	חפירת תעלה	3 ימים	18/12/23	20/12/23	310 ימים 113		312,318הה	
312	0%	1.4.5.2.2.6.3	הנחת צנרת פי ו׳ סי וסרט סימון	1 יום	21/12/23	21/12/23	311 ימים 129		313	
313	0%	1.4.5.2.2.6.4	מדידת מצב קיים לקיחת אזמייד לפני מילוי	1 יום	24/12/23	24/12/23	312 ימים 129		314	
314	0%	1.4.5.2.2.6.5	עטיפת צנרת	1 יום	25/12/23	25/12/23	313 ימים 129		315	
315	0%	1.4.5.2.2.6.6	מילוי חוזר	3 ימים	26/12/23	28/12/23	314 ימים 129		143	
316	0%	**1.4.5.2.2.7**	**עבודות חשמל ותקשורת**	**98 ימים**	**10/08/23**	**31/12/23**	**ימים 113**			
317	0%	1.4.5.2.2.7.1	סימון תוואי בשטח על ידי מודד מוסמך	3 ימים	10/08/23	14/08/23	303הה ימים 198		318	
318	0%	1.4.5.2.2.7.2	חפירת תעלה	3 ימים	18/12/23	20/12/23	311הה,317 ימים 113		319	
319	0%	1.4.5.2.2.7.3	הנחת צנרת פי ו׳ סי וסרט סימון	1 יום	21/12/23	21/12/23	318 ימים 113		320	
320	0%	1.4.5.2.2.7.4	מדידת מצב קיים לקיחת אזמייד לפני מילוי	1 יום	24/12/23	24/12/23	319 ימים 113		321	
321	0%	1.4.5.2.2.7.5	עטיפת צנרת	1 יום	25/12/23	25/12/23	320 ימים 113		322	
322	0%	1.4.5.2.2.7.6	מילוי חוזר	3 ימים	26/12/23	28/12/23	321 ימים 113		323	
323	0%	1.4.5.2.2.7.7	**סיום עבודות חשמל ותאורה**	1 יום	31/12/23	31/12/23	322 ימים 113		325	
324	0%	**1.4.5.2.2.8**	**מיסעה**	**7 ימים**	**01/01/24**	**09/01/24**	**ימים 113**			
325	0%	1.4.5.2.2.8.1	חור שכבת מצע א כולל הידוק ובדיקת מעבדה שכבה 1	3 ימים	01/01/24	03/01/24	323 ימים 113		326	
326	0%	1.4.5.2.2.8.2	חור שכבת מצע א כולל הידוק ובדיקת מעבדה שכבה 2	3 ימים	04/01/24	08/01/24	325 ימים 113		327	
327	0%	1.4.5.2.2.8.3	לקיחת מצב קיים מודד הכנה לאספלט	1 יום	09/01/24	09/01/24	326 ימים 113		328	
328	0%	1.4.5.2.2.9	**סיום עבודות כביש 110 חתך 066-074**	1 יום	07/05/24	08/05/24	292,293,283,232,233,301,3:388,500 ימים 48			
329	0%	**1.4.5.2.3**	**כביש 110 חתך 052-065**	**255 ימים**	**30/04/23**	**29/05/24**	**ימים 42**			
330	0%	**1.4.5.2.3.1**	**חפירות ומילוי חוזר**	**113 ימים**	**30/04/23**	**15/10/23**	**ימים 42**			
331	0%	1.4.5.2.3.1.1	חפירה לגובה שתית במבנה כביש	1 יום	23/07/23	23/07/23	272 ימים 93		332	
332	0%	1.4.5.2.3.1.2	עיבוד שתית חרסיתית לעומק 40ס"מ לכל רוחב רצועת הסלילה לרבות החזרתקרקע מקומית חפורה בעובי 20ס"מ	5 ימים	24/07/23	30/07/23	331 ימים 93		336	
333	0%	1.4.5.2.3.1.3	חפירה לקווי ביוב לפני עצירת עבודה	1 יום	15/10/23	15/10/23	229,50 ימים 42		336	
334	0%	1.4.5.2.3.1.4	**המשך חפירה לאחר קבלת תוכנית**	1 יום	30/04/23	30/04/23	49 ימים 154		336	
335	0%	**1.4.5.2.3.2**	**עבודות ביוב**	**37 ימים**	**16/10/23**	**05/12/23**	**ימים 42**			
336	0%	1.4.5.2.3.2.1	CLSM החלפת קרקע ומילוי על ידי	4 ימים	16/10/23	19/10/23	333,334,332 ימים 42		337	
337	0%	1.4.5.2.3.2.2	פיזור חול וביצוע שיפועים נדרשים	3 ימים	22/10/23	24/10/23	336 ימים 42		338	
338	0%	1.4.5.2.3.2.3	הנחת שוחות ביוב והתאמת גבהים לפי תוכנית	3 ימים	25/10/23	29/10/23	337 ימים 42		339	
339	0%	1.4.5.2.3.2.4	התקנת צנרת פי ו׳ סי לפי תוכנית והתאמת שיפועים נדרשים כולל בדיקות	4 ימים	30/10/23	02/11/23	338 ימים 42		340	
340	0%	1.4.5.2.3.2.5	לקיחת מצב קיים	1 יום	05/11/23	05/11/23	339 ימים 42		341	
341	0%	1.4.5.2.3.2.6	ריפוד צנרת על ידי חול מאושר כולל סימון בסרט	2 ימים	06/11/23	07/11/23	340 ימים 42		342	
342	0%	1.4.5.2.3.2.7	מילוי חוזר מאושר	4 ימים	08/11/23	13/11/23	341 ימים 42		343,346	
343	0%	1.4.5.2.3.2.8	ביצוע בדיקות מעבדה נדרשות כולל שטיפה	15 ימים	14/11/23	04/12/23	342 ימים 146		344	
344	0%	1.4.5.2.3.2.9	**סיום עבודות ביוב**	1 יום	05/12/23	05/12/23	343 ימים 146		387	
345	0%	**1.4.5.2.3.3**	**עבודות ניקוז**	**19 ימים**	**14/11/23**	**10/12/23**	**ימים 42**			
346	0%	1.4.5.2.3.3.1	הידוק שתית	4 ימים	14/11/23	19/11/23	342 ימים 42		347	
347	0%	1.4.5.2.3.3.2	CLSM 6.0mp החלפת קרקע על ידי יציקת	3 ימים	20/11/23	22/11/23	346 ימים 42		348	
348	0%	1.4.5.2.3.3.3	התקנת תא בקרה	4 ימים	23/11/23	28/11/23	347 ימים 42		349	
349	0%	1.4.5.2.3.3.4	התקנת והתחברויות צנרת בטון בין תאים	4 ימים	29/11/23	04/12/23	348 ימים 42		350	
350	0%	1.4.5.2.3.3.5	לקיחת מצב קיים על ידי מודד	2 ימים	05/12/23	06/12/23	349 ימים 42		351	
351	0%	1.4.5.2.3.3.6	עד תחתית מיסעה CLSM מילוי חוזר	1 יום	07/12/23	07/12/23	350 ימים 42		352,354	
352	0%	1.4.5.2.3.3.7	**סיום עבודות ניקוזים - מסירה לבקרת איכות**	1 יום	10/12/23	10/12/23	351 ימים 143		387	
353	0%	**1.4.5.2.3.4**	**קווי גז**	**41 ימים**	**10/12/23**	**04/02/24**	**ימים 42**			
354	0%	1.4.5.2.3.4.1	סימון תוואי בשטח על ידי מודד מוסמך	5 ימים	10/12/23	14/12/23	351 ימים 42		355	
355	0%	1.4.5.2.3.4.2	חפירת תעלה	10 ימים	17/12/23	28/12/23	354 ימים 42		356	
356	0%	1.4.5.2.3.4.3	ריתוך צנרת וקבלת אישורים	2 ימים	31/12/23	01/01/24	355 ימים 42		357	
357	0%	1.4.5.2.3.4.4	הנחה ועטיפת צנרת	10 ימים	02/01/24	15/01/24	356 ימים 42		358	
358	0%	1.4.5.2.3.4.5	בדיקות לחץ וקבלת אישורים	4 ימים	16/01/24	21/01/24	357 ימים 42		359	
359	0%	1.4.5.2.3.4.6	מילוי חוזר	7 ימים	22/01/24	30/01/24	358 ימים 42		360,362	
360	0%	1.4.5.2.3.4.7	**סיום עבודות גז ומסירה לבקרת איכות**	3 ימים	31/01/24	04/02/24	359 ימים 103		387	
361	0%	**1.4.5.2.3.5**	**עבודות קווי מים**	**44 ימים**	**31/01/24**	**25/04/24**	**ימים 42**			
362	0%	1.4.5.2.3.5.1	סימון תוואי בשטח על ידי מודד מוסמך	2 ימים	31/01/24	01/02/24	359 ימים 42		363	
363	0%	1.4.5.2.3.5.2	חפירת תעלה	5 ימים	04/02/24	08/02/24	362 ימים 42		364	
364	0%	1.4.5.2.3.5.3	ריתוך צנרת וקבלת אישורים	15 ימים	11/02/24	29/02/24	363 ימים 42		365	
365	0%	1.4.5.2.3.5.4	הנחה ועטיפת צנרת	15 ימים	03/03/24	04/04/24	364 ימים 42		366	
366	0%	1.4.5.2.3.5.5	בדיקות לחץ וקבלת אישורים	2 ימים	07/04/24	10/04/24	365 ימים 42		367	
367	0%	1.4.5.2.3.5.6	מילוי חוזר	5 ימים	11/04/24	25/04/24	366 ימים 42		369,376	
368	0%	**1.4.5.2.3.6**	**תשתיות השקייה**	**12 ימים**	**25/04/24**	**16/05/24**	**ימים 42**			
369	0%	1.4.5.2.3.6.1	סימון תוואי בשטח על ידי מודד מוסמך	3 ימים	25/04/24	02/05/24	367 ימים 42		370	
370	0%	1.4.5.2.3.6.2	חפירת תעלה	3 ימים	02/05/24	07/05/24	369 ימים 42		371	
371	0%	1.4.5.2.3.6.3	הנחת צנרת פי ו׳ סי וסרט סימון	1 יום	07/05/24	08/05/24	370 ימים 42		372	
372	0%	1.4.5.2.3.6.4	מדידת מצב קיים לקיחת אזמייד לפני מילוי	1 יום	08/05/24	09/05/24	371 ימים 42		373	
373	0%	1.4.5.2.3.6.5	עטיפת צנרת	1 יום	09/05/24	12/05/24	372 ימים 42		374	
374	0%	1.4.5.2.3.6.6	מילוי חוזר	3 ימים	12/05/24	16/05/24	373 ימים 42		381הה	
375	0%	**1.4.5.2.3.7**	**עבודות חשמל ותקשורת**	**13 ימים**	**25/04/24**	**19/05/24**	**ימים 42**			
376	0%	1.4.5.2.3.7.1	סימון תוואי בשטח על ידי מודד מוסמך	3 ימים	25/04/24	02/05/24	367 ימים 42		377	
377	0%	1.4.5.2.3.7.2	חפירת תעלה	3 ימים	02/05/24	07/05/24	376 ימים 42		378	
378	0%	1.4.5.2.3.7.3	הנחת צנרת פי ו׳ סי וסרט סימון	1 יום	07/05/24	08/05/24	377 ימים 42		379	
379	0%	1.4.5.2.3.7.4	מדידת מצב קיים לקיחת אזמייד לפני מילוי	1 יום	08/05/24	09/05/24	378 ימים 42		380	
380	0%	1.4.5.2.3.7.5	עטיפת צנרת	1 יום	09/05/24	12/05/24	379 ימים 42		381	
381	0%	1.4.5.2.3.7.6	מילוי חוזר	3 ימים	12/05/24	16/05/24	380,374הה ימים 42		382	
382	0%	1.4.5.2.3.7.7	**סיום עבודות חשמל ותאורה**	1 יום	16/05/24	19/05/24	381 ימים 42		384	
383	0%	**1.4.5.2.3.8**	**מיסעה**	**7 ימים**	**19/05/24**	**28/05/24**	**ימים 42**			
384	0%	1.4.5.2.3.8.1	חור שכבת מצע א כולל הידוק ובדיקת מעבדה שכבה 1	3 ימים	19/05/24	22/05/24	382 ימים 42		385	
385	0%	1.4.5.2.3.8.2	חור שכבת מצע א כולל הידוק ובדיקת מעבדה שכבה 2	3 ימים	22/05/24	27/05/24	384 ימים 42		386	
386	0%	1.4.5.2.3.8.3	לקיחת מצב קיים מודד הכנה לאספלט	1 יום	27/05/24	28/05/24	385 ימים 42		387	
387	0%	1.4.5.2.3.9	**סיום עבודות כביש 110 חתך 057-065**	1 יום	28/05/24	29/05/24	344,352,386,360 ימים 42		388	
388	0%	**1.4.5.3**	**סיום עבודות כביש הכנות לאספלט 110**	**1 יום**	**29/05/24**	**30/05/24**	**387,198,268,328 ימים 42**		**517**	
389	0%	**1.4.6**	**כביש 111**	**155 ימים**	**27/04/23**	**11/12/23**	**ימים 136**			
390	0%	**1.4.6.1**	**כביש 111 חתכים 9-1**	**154 ימים**	**27/04/23**	**10/12/23**	**ימים 136**			
391	0%	**1.4.6.1.1**	**כביש 111 09--0**	**154 ימים**	**27/04/23**	**10/12/23**	**ימים 136**			
392	0%	**1.4.6.1.1.1**	**חפירות**	**86 ימים**	**27/04/23**	**30/08/23**	**ימים 161**			
393	0%	1.4.6.1.1.1.1	חפירה עמוקה משופעת לצורך התקנת קווי ביוב	1 יום	27/04/23	27/04/23	ימים 241		399	
394	0%	1.4.6.1.1.1.2	חפירה לגובה שתית במבנה כביש	3 ימים	23/07/23	25/07/23	272 ימים 161		399,395	
395	0%	1.4.6.1.1.1.3	עיבוד שתית חרסיתית לעומק 40ס"מ לכל רוחב רצועת הסלילה לרבות החזרתקרקע מקומית חפורה בעובי 20ס"מ	3 ימים	26/07/23	30/07/23	394 ימים 161		409,396	
396	0%	1.4.6.1.1.1.4	מילוי בשכבות בחומר נברר	20 ימים	31/07/23	27/08/23	395 ימים 161		397	
397	0%	1.4.6.1.1.1.5	חפירה רדודה משופעת לצורך התקנת קו ניקוז וביצוע מילוי חוזר כולל הנחת קווי צנרת בטון בצד התעלה	3 ימים	28/08/23	30/08/23	396 ימים 161		409	
398	0%	**1.4.6.1.1.2**	**עבודות ביוב**	**48 ימים**	**26/07/23**	**05/10/23**	**ימים 182**			
399	0%	1.4.6.1.1.2.1	CLSM החלפת קרקע ומילוי על ידי	1 יום	26/07/23	26/07/23	394,393 ימים 182		400	
400	0%	1.4.6.1.1.2.2	פיזור חול וביצוע שיפועים נדרשים	1 יום	27/07/23	27/07/23	399 ימים 182		401	
401	0%	1.4.6.1.1.2.3	הנחת שוחות ביוב והתאמת גבהים לפי תוכנית	1 יום	30/07/23	30/07/23	400 ימים 182		402	
402	0%	1.4.6.1.1.2.4	התקנת צנרת פי ו׳ סי לפי תוכנית והתאמת שיפועים נד

מזהה	WBS	ביצוע %	שם פעילות	משך	התחלה	סיום	מרווח כולל	פעילויות קדם	פעילויות עוקבות	דד ליין מצ.ת.ה.
438	1.4.6.1.1.6.5	0%	עטיפת צנרת	1 יום	19/09/23	19/09/23	180 ימים	437	439	
439	1.4.6.1.1.6.6	0%	מילוי חוזר	3 ימים	20/09/23	26/09/23	180 ימים	438	446הה	
440	**1.4.6.1.1.7**	**0%**	**עבודות חשמל ותקשורת**	**13 ימים**	**12/11/23**	**28/11/23**	**136 ימים**			
441	1.4.6.1.1.7.1	0%	סימון תוואי בשטח על ידי מודד מוסמך	3 ימים	12/11/23	14/11/23	136 ימים	427,432	442	
442	1.4.6.1.1.7.2	0%	חפירת תעלה	3 ימים	15/11/23	19/11/23	136 ימים	441	443	
443	1.4.6.1.1.7.3	0%	הנחת צנרת פי וי סי וסרט סימון	1 יום	20/11/23	20/11/23	136 ימים	442	444	
444	1.4.6.1.1.7.4	0%	מדידת מצב קיים לקיחת אזמייד לפני מילוי	1 יום	21/11/23	21/11/23	136 ימים	443	445	
445	1.4.6.1.1.7.5	0%	עטיפת צנרת	1 יום	22/11/23	22/11/23	136 ימים	444	446	
446	1.4.6.1.1.7.6	0%	מילוי חוזר	3 ימים	23/11/23	27/11/23	136 ימים	445,439הה	447	
447	1.4.6.1.1.7.7	0%	**סיום עבודות חשמל ותאורה**	1 יום	28/11/23	28/11/23	136 ימים	446	449	
448	**1.4.6.1.1.8**	**0%**	**מיסעה**	**8 ימים**	**29/11/23**	**10/12/23**	**136 ימים**			
449	1.4.6.1.1.8.1	0%	פיזור שכבת מצע א כולל הידוק ובדיקת מעבדה שכבה 1	3 ימים	29/11/23	03/12/23	136 ימים	447	450	
450	1.4.6.1.1.8.2	0%	פיזור שכבת מצע א כולל הידוק ובדיקת מעבדה שכבה 2	3 ימים	04/12/23	06/12/23	136 ימים	449	451	
451	1.4.6.1.1.8.3	0%	לקיחת מצב קיים מודד הכנה לאספלט	1 יום	07/12/23	07/12/23	136 ימים	450	452	
452	1.4.6.1.1.8.4	0%	**סיום עבודות מיסעה**	1 יום	10/12/23	10/12/23	136 ימים	451	453	
453	**1.4.6.2**	**0%**	**סיום עבודות כביש הכנות לאספלט 111 109--100**	**1 יום**	**11/12/23**	**11/12/23**	**136 ימים**	**452,407,416,425**	**517,512**	
454	**1.4.7**	**0%**	**כביש 113**	**189 ימים**	**23/07/23**	**15/05/24**	**46 ימים**			
455	**1.4.7.1**	**0%**	**כביש 113 003-001**	**188 ימים**	**23/07/23**	**14/05/24**	**46 ימים**			
456	**1.4.7.1.1**	**0%**	**חפירות ומילוי חוזר**	**65 ימים**	**23/07/23**	**25/10/23**	**46 ימים**			
457	1.4.7.1.1.1	0%	חפירה לגובה שתית במבנה כביש	1 יום	23/07/23	23/07/23	46 ימים	272	458	
458	1.4.7.1.1.2	0%	עיבוד שתית הרסיתית לעומק 40ס"מ לכל רוחב רצועת הסלילה לרבות החזרתקרקע מקומית חפורה בעובי 20ס"מ	3 ימים	24/07/23	26/07/23	46 ימים	457	459	
459	1.4.7.1.1.3	0%	מילוי בשכבות בחומר נברר	16 ימים	27/07/23	17/08/23	46 ימים	458	460	
460	1.4.7.1.1.4	0%	חפירה רדודה משופעת לצורך התקנת קו ניקוז וביצוע מילוי חוזר כולל הנחת קווי צנרת בטון בצד התעלה	45 ימים	20/08/23	25/10/23	46 ימים	459	462	
461	**1.4.7.1.2**	**0%**	**עבודות ניקוז**	**51 ימים**	**26/10/23**	**04/01/24**	**46 ימים**			
462	1.4.7.1.2.1	0%	הידוק שתית	2 ימים	26/10/23	29/10/23	46 ימים	460	463	
463	1.4.7.1.2.2	0%	+ החלפת קרקע מתחת צנרת ושוחות על ידי יציקת יבש CLSM 6.0mp	2 ימים	30/10/23	31/10/23	46 ימים	462	464	
464	1.4.7.1.2.3	0%	התקנת תא בקרה	40 ימים	01/11/23	26/12/23	46 ימים	463	465	
465	1.4.7.1.2.4	0%	התקנת והתחברויות צנרת בטון בין תאים	3 ימים	27/12/23	31/12/23	46 ימים	464	466	
466	1.4.7.1.2.5	0%	לקיחת מצב קיים על ידי מודד	1 יום	01/01/24	01/01/24	46 ימים	465	467	
467	1.4.7.1.2.6	0%	עד תחתית מיסעה CLSM מילוי חוזר	2 ימים	02/01/24	03/01/24	46 ימים	466	468,470	
468	1.4.7.1.2.7	0%	**סיום עבודות ניקוזים - מסירה לבקרת איכות**	1 יום	04/01/24	04/01/24	125 ימים	467	497	
469	**1.4.7.1.3**	**0%**	**עבודות קווי מים**	**44 ימים**	**04/01/24**	**05/03/24**	**46 ימים**			
470	1.4.7.1.3.1	0%	סימון תוואי בשטח על ידי מודד מוסמך	2 ימים	04/01/24	07/01/24	46 ימים	467	471	
471	1.4.7.1.3.2	0%	חפירת תעלה	5 ימים	08/01/24	14/01/24	46 ימים	470	472	
472	1.4.7.1.3.3	0%	ריתוך צנרת וקבלת אישורים	15 ימים	15/01/24	04/02/24	46 ימים	471	473	
473	1.4.7.1.3.4	0%	הנחה ועטיפת צנרת	15 ימים	05/02/24	25/02/24	46 ימים	472	474	
474	1.4.7.1.3.5	0%	בדיקות לחץ וקבלת אישורים	2 ימים	26/02/24	27/02/24	46 ימים	473	475	
475	1.4.7.1.3.6	0%	מילוי חוזר	5 ימים	28/02/24	05/03/24	46 ימים	474	477,484	
476	**1.4.7.1.4**	**0%**	**תשתיות השקייה**	**12 ימים**	**06/03/24**	**04/04/24**	**46 ימים**			
477	1.4.7.1.4.1	0%	סימון תוואי בשטח על ידי מודד מוסמך	3 ימים	06/03/24	11/03/24	46 ימים	475	478	
478	1.4.7.1.4.2	0%	חפירת תעלה	3 ימים	12/03/24	19/03/24	46 ימים	477	479	
479	1.4.7.1.4.3	0%	הנחת צנרת פי וי סי וסרט סימון	1 יום	20/03/24	21/03/24	46 ימים	478	480	
480	1.4.7.1.4.4	0%	מדידת מצב קיים לקיחת אזמייד לפני מילוי	1 יום	24/03/24	25/03/24	46 ימים	479	481	
481	1.4.7.1.4.5	0%	עטיפת צנרת	1 יום	26/03/24	27/03/24	46 ימים	480	482	
482	1.4.7.1.4.6	0%	מילוי חוזר	3 ימים	28/03/24	04/04/24	46 ימים	481	485הה	
483	**1.4.7.1.5**	**0%**	**עבודות חשמל ותקשורת**	**19 ימים**	**06/03/24**	**25/04/24**	**46 ימים**			
484	1.4.7.1.5.1	0%	סימון תוואי בשטח על ידי מודד מוסמך	3 ימים	06/03/24	11/03/24	52 ימים	475	485	
485	1.4.7.1.5.2	0%	חפירת תעלה	3 ימים	28/03/24	04/04/24	46 ימים	484,482הה	486	
486	1.4.7.1.5.3	0%	הנחת צנרת פי וי סי וסרט סימון	1 יום	07/04/24	08/04/24	46 ימים	485	487	
487	1.4.7.1.5.4	0%	מדידת מצב קיים לקיחת אזמייד לפני מילוי	1 יום	09/04/24	10/04/24	46 ימים	486	488	
488	1.4.7.1.5.5	0%	עטיפת צנרת	1 יום	11/04/24	14/04/24	46 ימים	487	489	
489	1.4.7.1.5.6	0%	מילוי חוזר	3 ימים	15/04/24	24/04/24	46 ימים	488	490	
490	1.4.7.1.5.7	0%	**סיום עבודות חשמל ותאורה**	1 יום	24/04/24	25/04/24	46 ימים	489	492	
491	**1.4.7.1.6**	**0%**	**מיסעה**	**10 ימים**	**25/04/24**	**14/05/24**	**46 ימים**			
492	1.4.7.1.6.1	0%	פיזור שכבת מצע א כולל הידוק ובדיקת מעבדה שכבה 1	2 ימים	25/04/24	01/05/24	46 ימים	490	493,8	
493	1.4.7.1.6.2	0%	פיזור שכבת מצע א כולל הידוק ובדיקת מעבדה שכבה 2	2 ימים	01/05/24	05/05/24	46 ימים	492,8	494	
494	1.4.7.1.6.3	0%	לקיחת מצב קיים מודד הכנה לאספלט	1 יום	05/05/24	06/05/24	46 ימים	493	495	
495	1.4.7.1.6.4	0%	הנחת אבני שפה	4 ימים	06/05/24	12/05/24	46 ימים	494	496	
496	1.4.7.1.6.5	0%	**סיום עבודות מיסעה**	1 יום	12/05/24	14/05/24	46 ימים	495	497,508	
497	**1.4.7.2**	**0%**	**סיום עבודות כביש הכנות לאספלט 113 205-200**	**1 יום**	**14/05/24**	**15/05/24**	**53 ימים**	**496,468**	**517**	
498	**1.4.8**	**0%**	**סלילת אספלט**	**98 ימים**	**12/12/23**	**26/05/24**	**46 ימים**			
499	**1.4.8.1**	**0%**	**כביש 110 צפוני**	**8 ימים**	**08/05/24**	**21/05/24**	**48 ימים**			
500	1.4.8.1.1	0%	לקיחת מצב קיים ואישור מתכננים	5 ימים	08/05/24	16/05/24	48 ימים	328	501	
501	1.4.8.1.2	0%	פיזור ביטומן	1 יום	16/05/24	19/05/24	48 ימים	500	502	
502	1.4.8.1.3	0%	סלילת אספלט בחתכי כביש ומדרכות בכל אזור המגרש	2 ימים	19/05/24	21/05/24	48 ימים	501	515	
503	**1.4.8.2**	**0%**	**כביש 110 דרומי**	**8 ימים**	**27/02/24**	**07/03/24**	**80 ימים**			
504	1.4.8.2.1	0%	לקיחת מצב קיים ואישור מתכננים	5 ימים	27/02/24	04/03/24	80 ימים	198	505	
505	1.4.8.2.2	0%	פיזור ביטומן	1 יום	05/03/24	05/03/24	80 ימים	504	506	
506	1.4.8.2.3	0%	סלילת אספלט בחתכי כביש ומדרכות בכל אזור המגרש	2 ימים	06/03/24	07/03/24	80 ימים	505	515	
507	**1.4.8.3**	**0%**	**כביש 113**	**7 ימים**	**14/05/24**	**23/05/24**	**46 ימים**			
508	1.4.8.3.1	0%	לקיחת מצב קיים ואישור מתכננים	5 ימים	14/05/24	21/05/24	46 ימים	496	509	
509	1.4.8.3.2	0%	פיזור ביטומן	1 יום	21/05/24	22/05/24	46 ימים	508	510	
510	1.4.8.3.3	0%	סלילת אספלט בחתכי כביש ומדרכות בכל אזור המגרש	1 יום	22/05/24	23/05/24	46 ימים	509	515	
511	**1.4.8.4**	**0%**	**כביש 111**	**7 ימים**	**12/12/23**	**20/12/23**	**136 ימים**			
512	1.4.8.4.1	0%	לקיחת מצב קיים ואישור מתכננים	5 ימים	12/12/23	18/12/23	136 ימים	453	513	
513	1.4.8.4.2	0%	פיזור ביטומן	1 יום	19/12/23	19/12/23	136 ימים	512	514	
514	1.4.8.4.3	0%	סלילת אספלט בחתכי כביש ומדרכות בכל אזור המגרש	1 יום	20/12/23	20/12/23	136 ימים	513	515	
515	**1.4.8.5**	**0%**	**סיום עבודות סלילת אספלטים**	**1 יום**	**23/05/24**	**26/05/24**	**46 ימים**	**510,502,506,514**	**517,9**	
516	**1.5**	**0%**	**סיום הפרויקט**	**56 ימים**	**05/08/24**	**24/10/24**	**0 ימים**			
517	1.5.1	0%	מרווח ביטחון	1 חודש	05/08/24	04/09/24	0 חודשים	149,453,388,94,497,515,6	519,523	
518	**1.5.2**	**0%**	**מסירות**	**34 ימים**	**04/09/24**	**24/10/24**	**0 ימים**			
519	1.5.2.1	0%	מסירת תכניות עדות ו-AS MADS	13 ימים	04/09/24	23/09/24	0 ימים	517,9	520	
520	1.5.2.2	0%	מסירה ראשונה למזמין והשלמות	10 ימים	23/09/24	09/10/24	0 ימים	519	521	
521	1.5.2.3	0%	מסירה שנייה למזמין והשלמות	10 ימים	09/10/24	23/10/24	0 ימים	520	522	
522	1.5.2.4	0%	סיום מסירות	1 יום	23/10/24	24/10/24	0 ימים	521	523,10	
523	1.5.3	0%	**סיום הפרוייקט**	0 ימים	24/10/24	24/10/24	0 ימים	517,522,10		

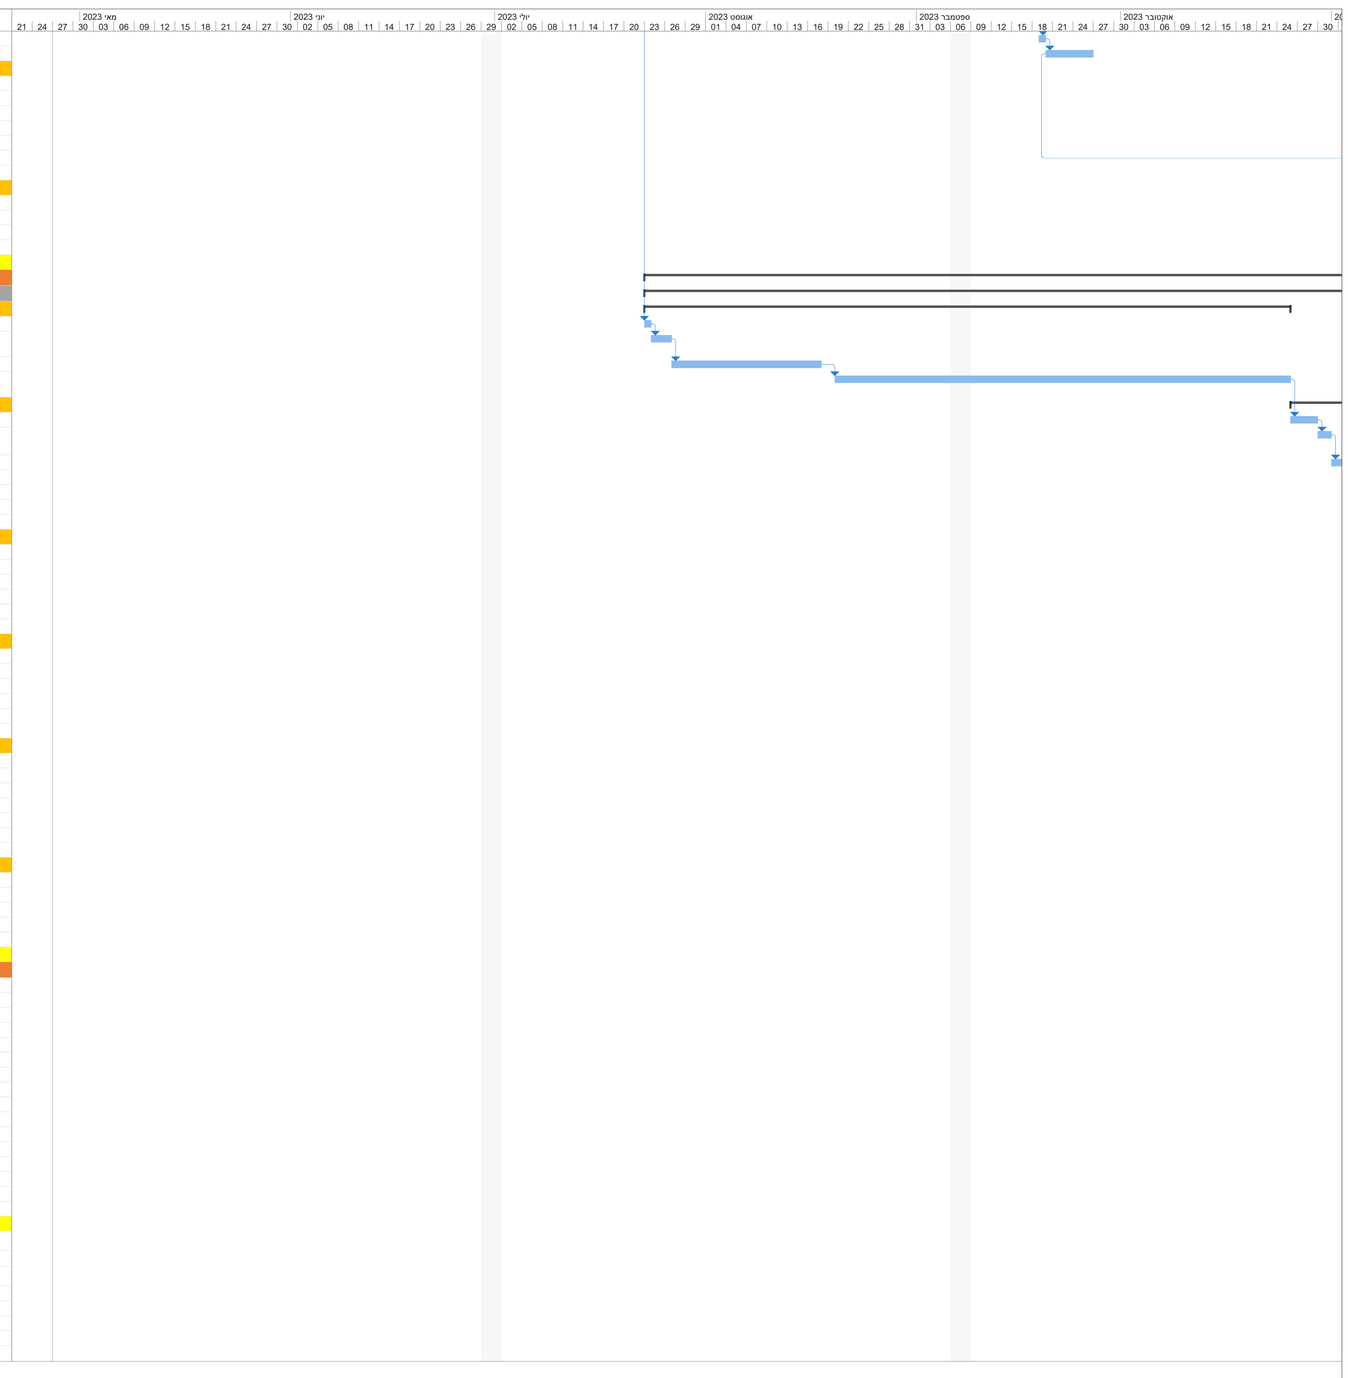

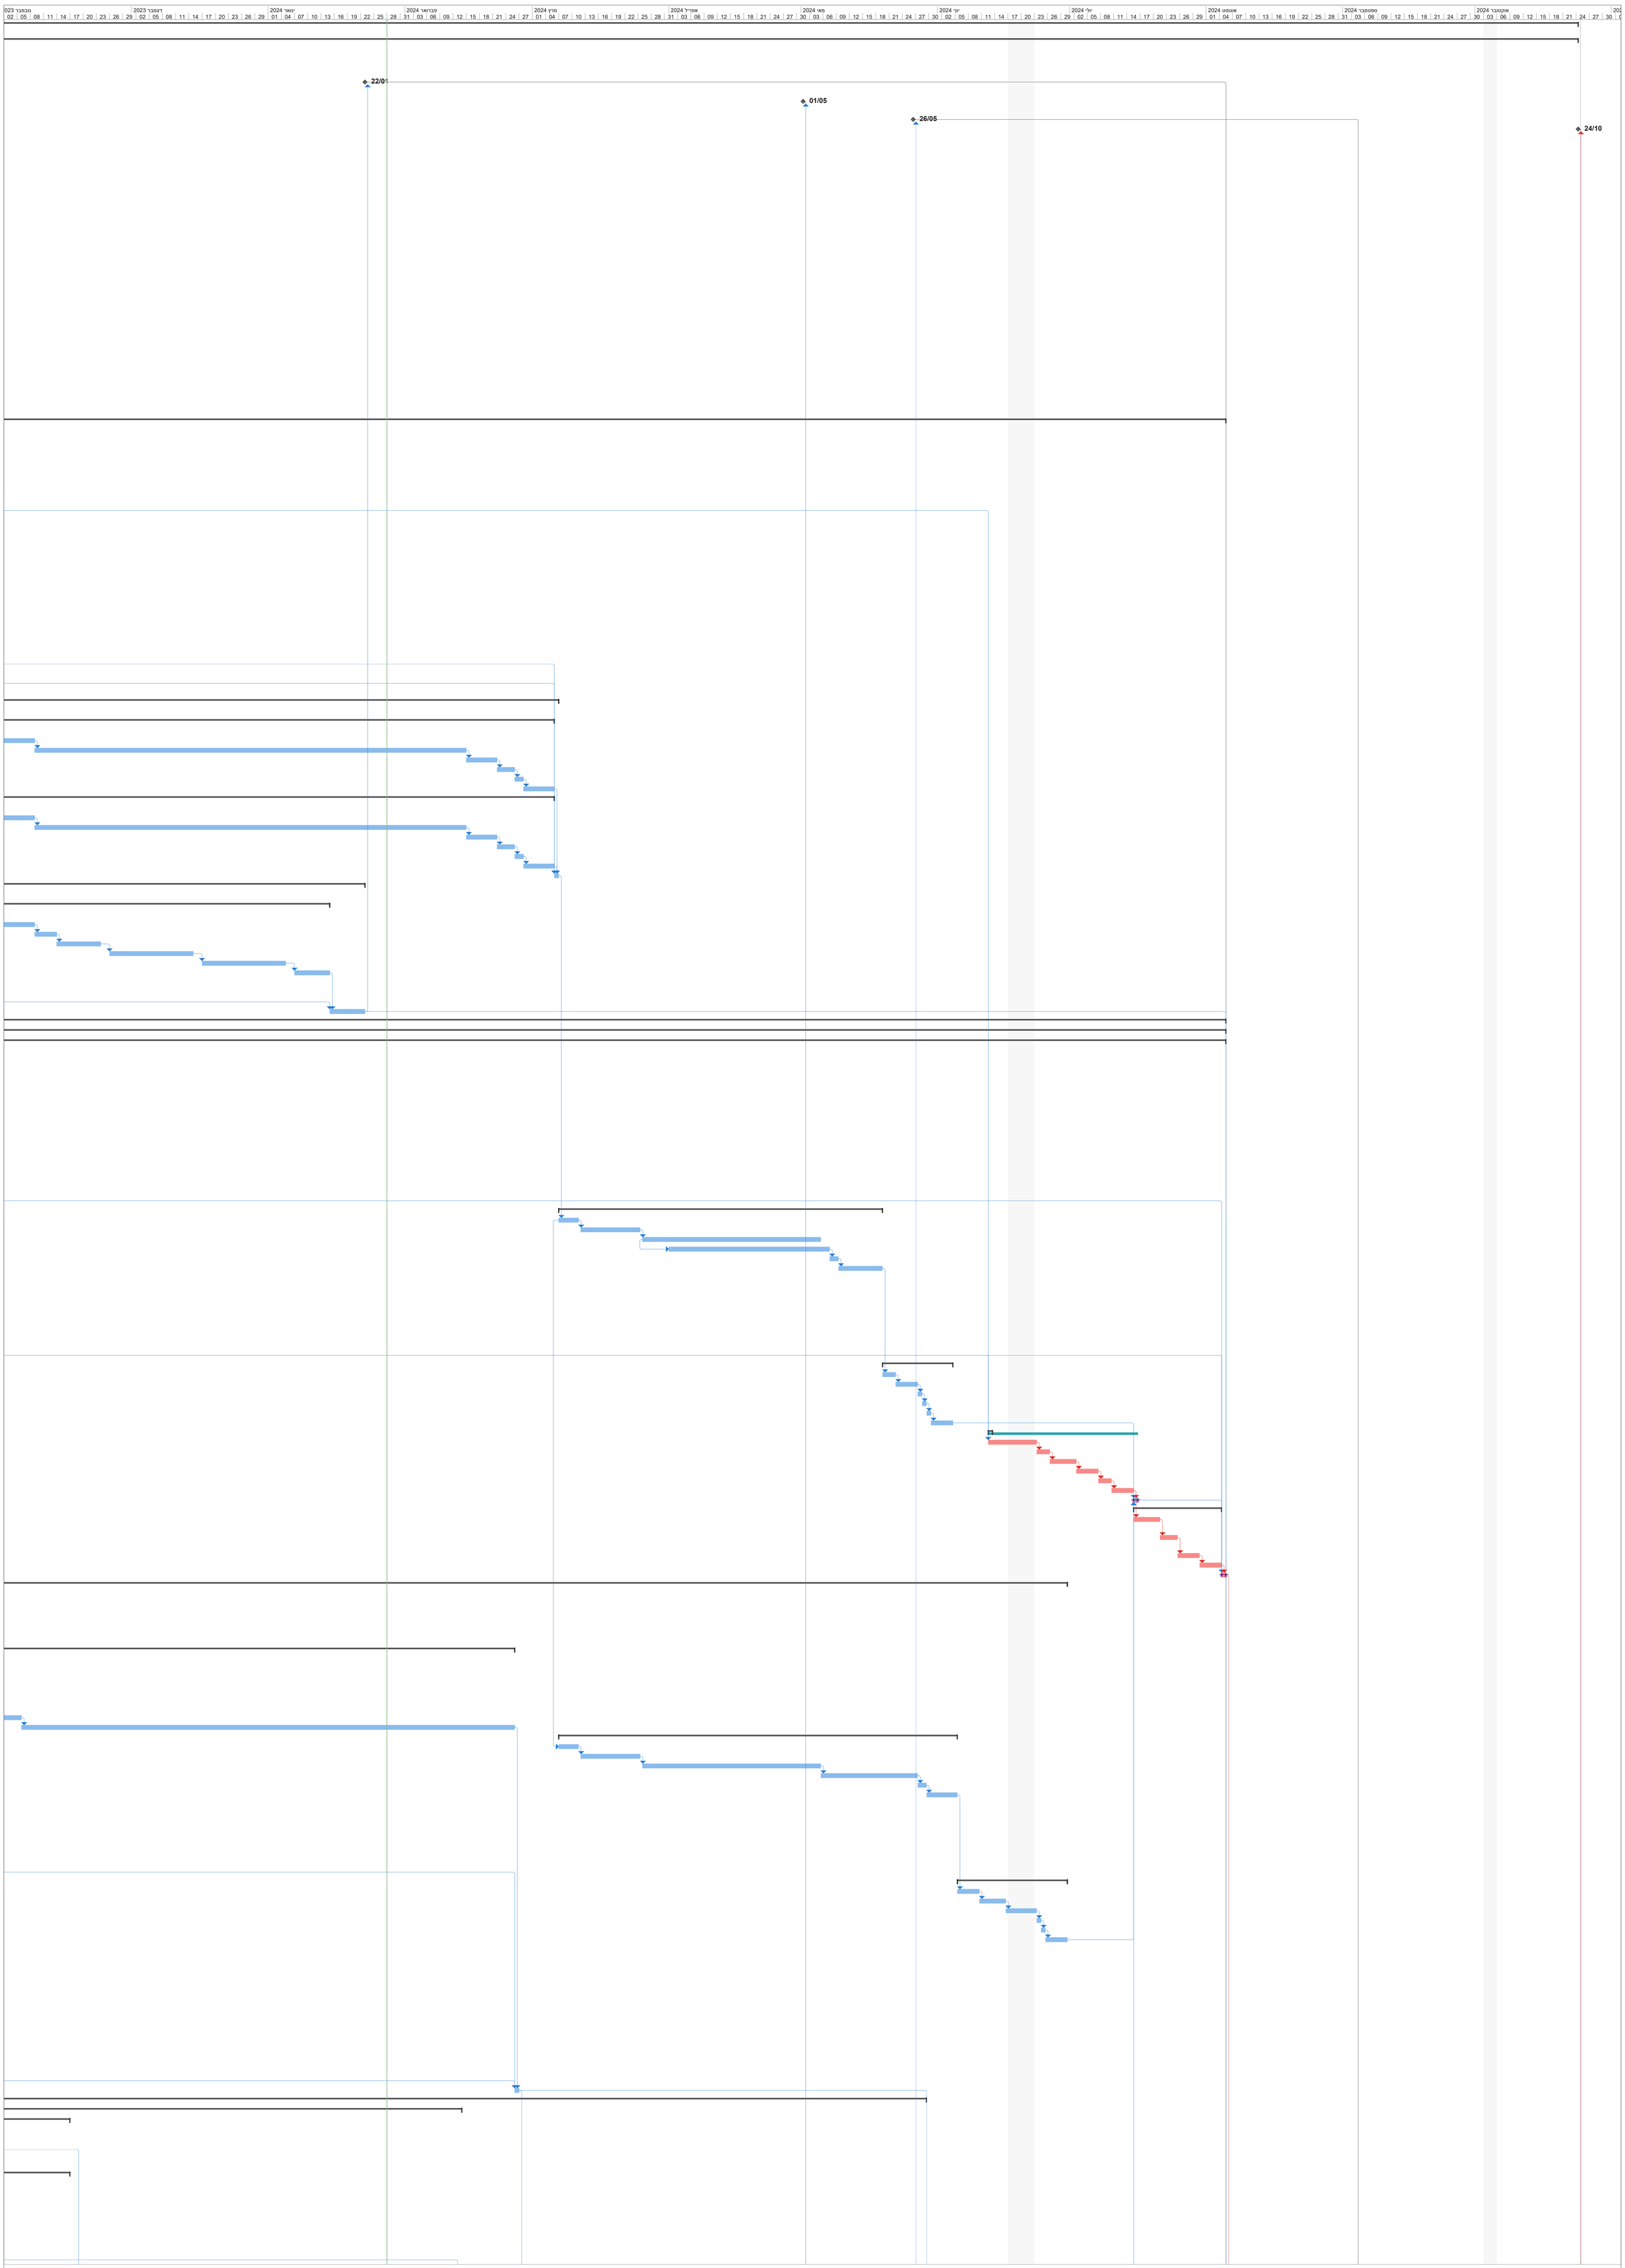
נובמבר 2023
דצמבר 2023
ינואר 2024
פברואר 2024
מרץ 2024
אפריל 2024
מאי 2024
יוני 2024
יולי 2024
אוגוסט 2024
ספטמבר 2024
אוקטובר 2024
22/01
01/05
26/05
24/10
פרויקט:
אבן דרך
ערסל פרוייקט
אבן דרך לא פעילה
פעילות ידנית
סיכום ערסל ידני
התחלה-בלבד
פעילות היצונית
תאריך יעד
פיצול קריטי
אבן דרך בסיסית
התקדמות
HCP
פיצול
ערסל
פעילות לא פעילה
ערסל לא פעיל
משך-בלבד
ערסל ידני
סיום-בלבד
אבן דרך היצונית
קריטי
תוכנית בסיסית
ערסל בסיסי
התקדמות ידנית

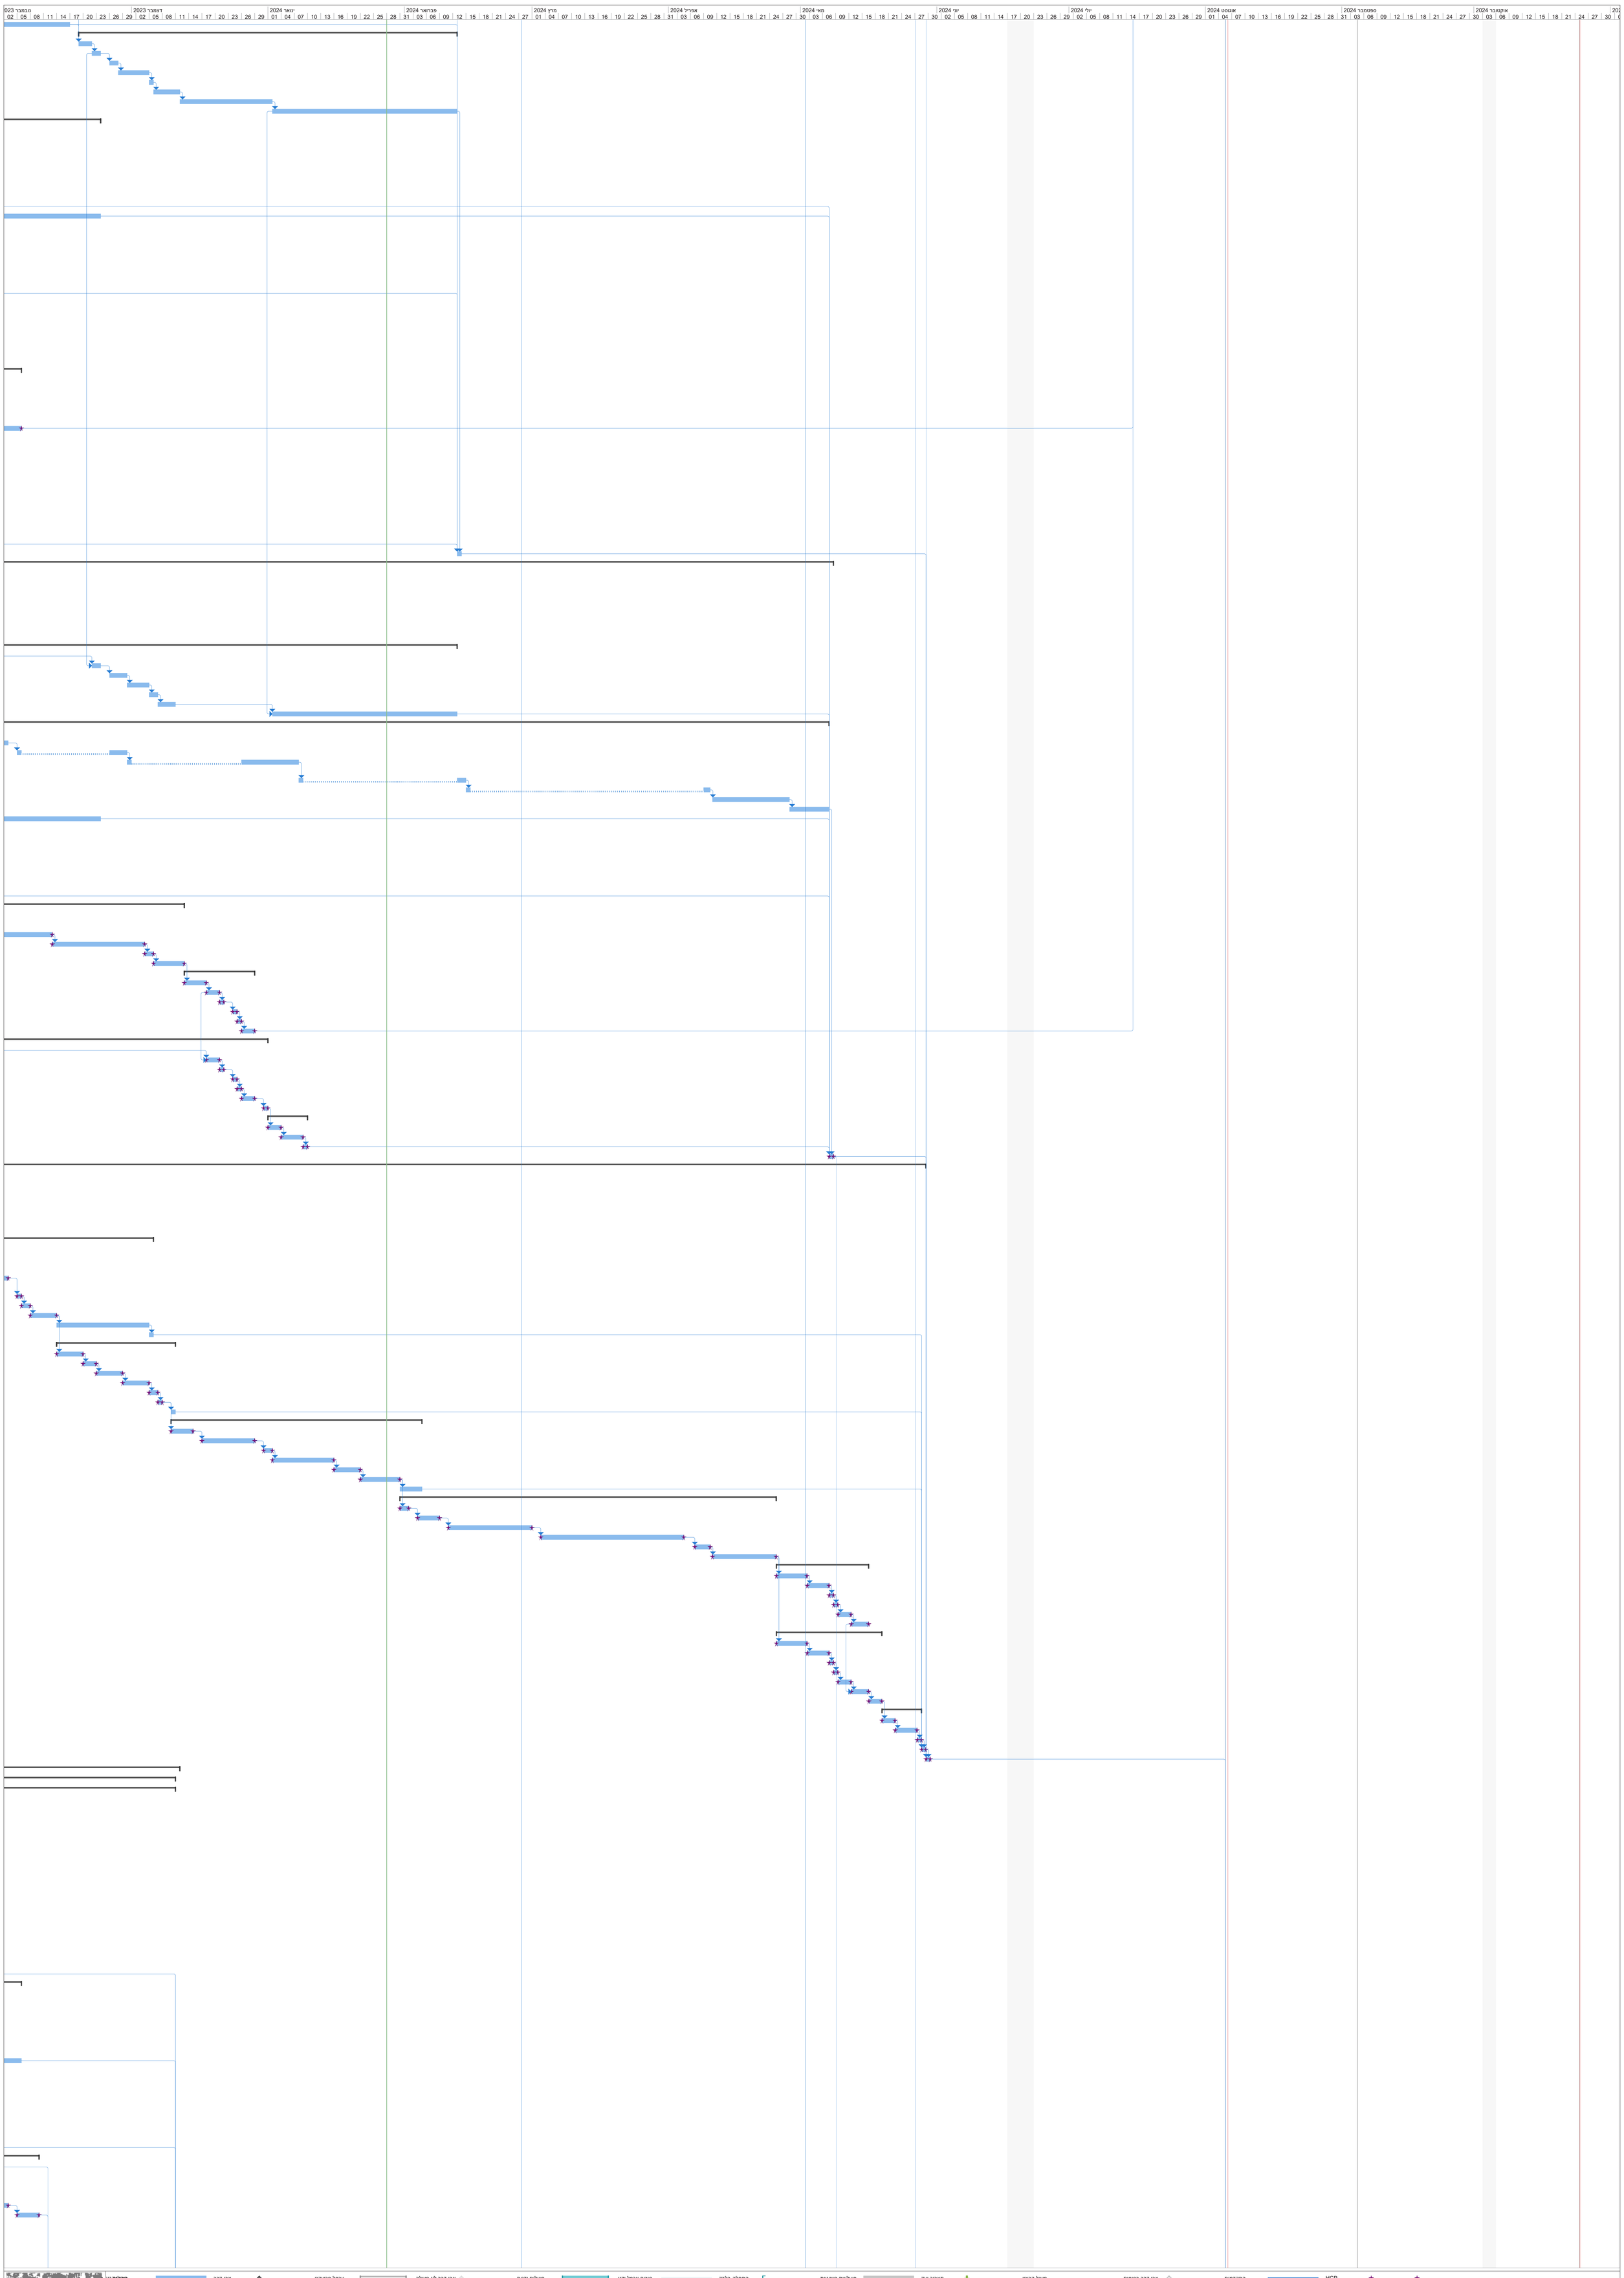
נובמבר 2023
דצמבר 2023
ינואר 2024
פברואר 2024
מרץ 2024
אפריל 2024
מאי 2024
יוני 2024
יולי 2024
אוגוסט 2024
ספטמבר 2024
אוקטובר 2024
פרוייקט:
אבן דרך
ערסל פרוייקט
אבן דרך לא פעילה
פעילות ידנית
סיכום ערסל ידני
התחלה-בלבד
פעילויות חיצוניות
תאריך יעד
פיצול קריטי
אבן דרך בסיסית
התקדמות
HCP
פיצול
ערסל
פעילות לא פעילה
ערסל לא פעיל
משך-בלבד
ערסל ידני
סיום-בלבד
אבן דרך חיצונית
קריטי
תוכנית בסיסית
ערסל בסיסי
התקדמות ידנית

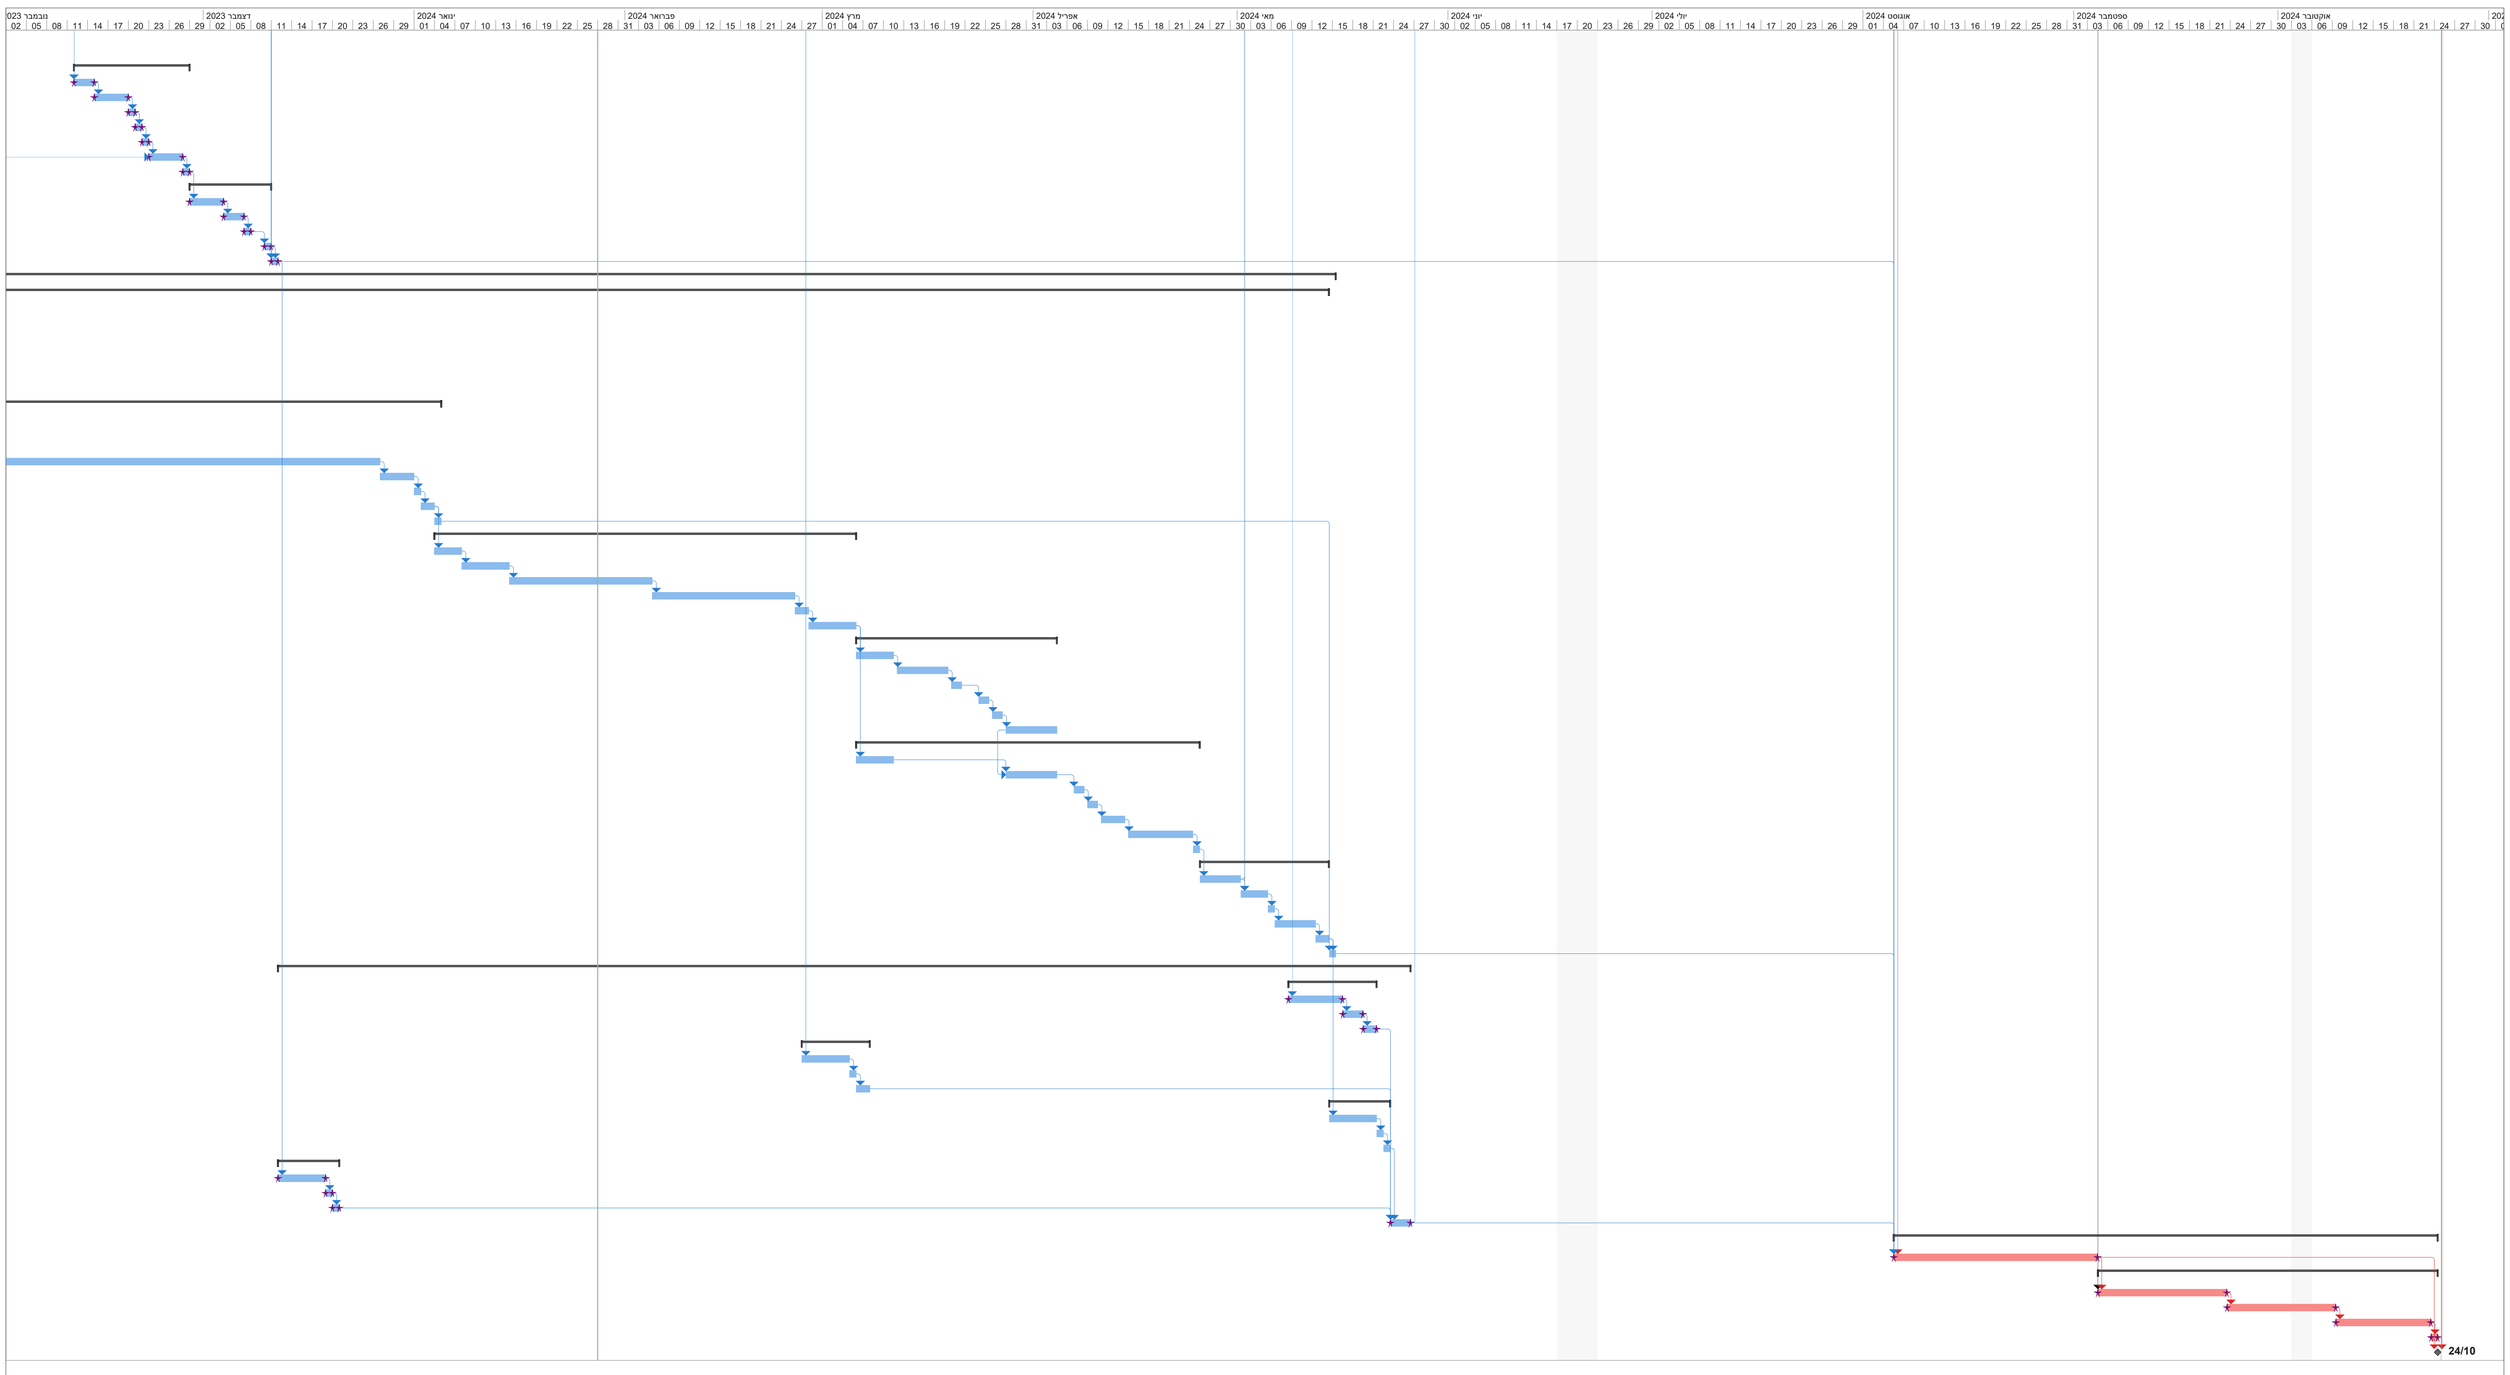

פרוייקט: אבן דרך | ערסל פרוייקט | אבן דרך לא פעילה | פעילות ידנית | סיכום ערסל ידני | התחלה-בלבד | פעילויות חיצוניות | תאריך יעד | פיצול קריטי | אבן דרך בסיסית | התקדמות | HCP
פיצול | ערסל | פעילות לא פעילה | ערסל לא פעיל | משך-בלבד | ערסל ידני | סיום-בלבד | אבן דרך חיצונית | קריטי | תוכנית בסיסית | ערסל בסיסי | התקדמות ידנית
